


ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA

VĒSTURISKO CELTŅU IZPĒTE
REKONSTRUKCIJAS - RESTAURĀCIJAS PROJEKTI
ARHEOLOGISKĀ IZPĒTE
KONSULTĀCIJAS



Vienotais Reģistrācijas NR. LV 40003041528, Būvkomersanta Reģistrācijas NR. 2326-R

PASŪTĪJUMS NR.:

2017-032

PASŪTĪTĀJS:

KOKNESES NOVADA DOME
MELIORATORU IELA 1, KOKNESE, KOKNESES PAGASTS,
KOKNESES NOVADS, LV5113
REĢ.NR. LV90000043494

BŪVOBJEKTS:

KOKNESES VIDUSLAIKU PILSDRUPAS
VALSTS NOZĪMES ARHITEKTŪRAS PIEMINEKLIS NR. 6160

KADASTRS:

3260 013 0507 001

CC:

1273

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻA
"KOKNESES PILSDRUPAS"
KONSERVĀCIJAS DARBI UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
BŪVPROJEKTS - IZMAIŅAS
(BŪVVALDES ĀKCEPTS NR.249, 27.06.2016. MBP STADIJA;
PROJEKTĒŠANAS NOTEIKUMI IZPILDĪTI 09.01.2017.)

SĒJUMS:

1.1

STADIJA:

BP IZMAIŅAS

DAĻA:

ĢENERĀLPLĀNS, DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS,
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

MARKA:

ĢP, DOP, BA

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA:

B. EGLĀJA

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:

*Šajā Būvprojektā ir iekļautas un
izstrādātas visas nepieciešamās
daļas, atbilstoši Būvatļaujā
ietvertajiem nosacījumiem*

(SEPT.NR. 10-0758) ARTŪRS LAPINŠ

29.06.2017.

BŪVPROJEKTA ARHITEKTS:

A.LAPINŠ



RĪGA, 2017.

Projekts: Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi
 Pasūtītājs: Kokneses novada dome
 Projekta stadija: Būvprojekts - IZMAIŅAS
 Sējuma Nr. 1.1. ĢP, DOP, BA

PROJEKTA SAGATAVOŠANAS DARBI

Sējuma nr.	Sējuma nosaukums, autors, gads	Marka
	Kokneses viduslaiku pilsdrupu teritorijas attīstības mets. Arhitektūra, Labiekārtojums. <i>Rīga, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa". A.Lapiņš, G.Jansons, M.Reinbergs. 2016.g.</i>	AR
	Topogrāfiskais uzmērījums. <i>SIA "DKM". Ģ.Kaminskis. 2016.g.</i>	TI
	.. Kokneses pils atsevišķu daļu telpiskā uzmērīšana. Smart Engineering, 2013.g.	UR

AKCEPTĒTĀ BŪVPROJEKTA SASTĀVS (iepriekš veiktie darbi)

Sējuma nr.	Sējuma nosaukums, autors, gads	Marka
1.	Valsts kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi. Būvprojekts. Ģenerālpilāns, Arhitektūra, Labiekārtojums, Būvkonstrukcijas, Darbu organizēšanas projekts. <i>Rīga, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa". A.Lapiņš, G.Jansons, K.Klimbe, A.Rudzis. 2016.g.</i>	ĢP, AR, BK, DOP
2.	Valsts kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi. Būvprojekts. Būvdarbu apjomu saraksts. <i>Rīga, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa". A.Lapiņš. 2016.g.</i>	BA
3.	Valsts kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi. Būvprojekts. Izmaksu aprēķins (Tāmes). <i>Rīga, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa". A.Lapiņš, E.Pētersons. 2016.g.</i>	T
	Būvprojekta ekspertīzes atzinums. 2016. gads.	

IZMAIŅU BŪVPROJEKTA SASTĀVS

Sējuma nr.	Sējuma nosaukums, autors, gads	Marka
1.1.	Valsts kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi. Būvprojekts - Izmaiņas. Ģenerālpilāns, Darbu organizēšanas projekts, Būvdarbu apjomu saraksts. <i>Rīga, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa". A.Lapiņš. 2017.g.</i>	ĢP, DOP, BA
3.1.	Valsts kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi. Būvprojekts - Izmaiņas. Izmaksu aprēķins (Tāmes). <i>Rīga, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa". A.Lapiņš, E.Pētersons. 2017.g.</i>	T

Projekts: Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi
 Adrese: "Kokneses pilsdrupas", Kokneses novads
 Pasūtītājs: Kokneses novada dome
 Projekta stadija: Būvprojekts - IZMAIŅAS
 Sējuma Nr. **1.1. ĢP, DOP, BA.**
Ģenerālplāns, Darbu organizēšanas projekts, Būvdarbu apjomu saraksts

SATURA RĀDĪTĀJS

N.p.k.	Dokumenta/lapas nosaukums	Lapas nr.
1.	Titullapa	1
2.	Būvprojekta sastāvs	2
3.	Satura rādītājs	3
4.	Pasūtītāja projektēšanas uzdevums	4
5.	Zemesgrāmatu apliecības kopija	5
6.	Zemes robežu plāna kopija	6-8
7.	Rasējuma GP0-01 "Ģenerālplāns. Vispārīgie rādītāji. Rasējumu saraksts" (24.05.2016, izmaiņa 0) ar VKPAI skaņojumu kopija [no Akceptētā būvprojekta]	9
8.	VKPAI būvprojekta atbalsta vēstules Nr. 11-03/1900 ar datumu 17.06.2016 kopija	10-11
9.	VKPAI būvprojekta izmaiņu atbalsta vēstules Nr. 11-02/3509 ar datumu 20.07.2017 kopija	12
10.	Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinājuma kopija	13
11.	Skaidrojošs apraksts par Projekta dalīšanu kārtās	14-15
12.	Izmaiņu rasējumu saraksts	16
13.	Rasējums GP0-01 "Ģenerālplāns. Vispārīgie rādītāji. Rasējumu saraksts" (02.06.2017., izmaiņa 2)	17
14.	1.kārtas darbi – Mūra sienu galu "A" (sienai G) un "D" (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi :	18
15.	Rasējums DOP1-011 "Būvdarbu ģenerālplāns. 1.kārtas darbi" (02.06.2017., izmaiņa 2)	19
16.	Būvdarbu apjomu saraksts 1.kārtas darbiem	20-23
17.	2.kārtas darbi – Mūra sienu galu "B" (sienai G) un "C" (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi :	24
18.	Rasējums DOP1-012 "Būvdarbu ģenerālplāns. 2.kārtas darbi" (02.06.2017., izmaiņa 2)	25
19.	Būvdarbu apjomu saraksts 2.kārtas darbiem	26-29
20.	3.kārtas darbi – Mūra sienas "G" ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi [Pērses puse]; Mūra sienas "A" dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi [Daugavas puse]; Labiekārtošanas darbi :	30
21.	Rasējums DOP1-013 "Būvdarbu ģenerālplāns. 3.kārtas darbi" (02.06.2017., izmaiņa 2)	31
22.	Būvdarbu apjomu saraksts 3.kārtas darbiem	32-41
23.	4.kārtas darbi – Mūra sienas "G" dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi [Pagalma puse] :	42
24.	Rasējums DOP1-014 "Būvdarbu ģenerālplāns. 4.kārtas darbi" (02.06.2017., izmaiņa 2)	43
25.	Būvdarbu apjomu saraksts 4.kārtas darbiem	44-48
26.	5.kārtas darbi – Mūra sienas "A" ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi [Pagalma puse] :	49
27.	Rasējums DOP1-015 "Būvdarbu ģenerālplāns. 5.kārtas darbi" (02.06.2017., izmaiņa 2)	50
28.	Būvdarbu apjomu saraksts 5.kārtas darbiem	51-55
29.	6.kārtas darbi – Mūra sienas "A" ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi [Pagalma puse] :	56
30.	Rasējums DOP1-016 "Būvdarbu ģenerālplāns. 6.kārtas darbi" (02.06.2017., izmaiņa 2)	57
31.	Būvdarbu apjomu saraksts 6.kārtas darbiem	58-61
32.	7.kārtas darbi – Mūra sienas "F" ziemeļu un dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi :	62
33.	Rasējums DOP1-017 "Būvdarbu ģenerālplāns. 7.kārtas darbi" (02.06.2017., izmaiņa 2)	63
34.	Būvdarbu apjomu saraksts 7.kārtas darbiem	64-68
35.	8.kārtas darbi – Mūra sienu "E", "I" un "ZA" fasāžu konstrukciju konservācijas darbi :	69
36.	Rasējums DOP1-018 "Būvdarbu ģenerālplāns. 8.kārtas darbi" (02.06.2017., izmaiņa 2)	70
37.	Būvdarbu apjomu saraksts 8.kārtas darbiem	71-74
38.	Komersanta reģistrācijas apliecības kopija	75
39.	Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija	76
40.	Artūra Lapiņa sertifikāta kopija	77

DARBA UZDEVUMS
KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJAS UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS
BŪVPROJEKTA SADALĪŠANAI KĀRTĀS

1. **Pasūtītājs:** Kokneses novada dome
2. **Objekta nosaukums:** Kokneses viduslaiku pilsdrupas, valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.118, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160
3. **Objekta adrese:** "Kokneses pilsdrupas", Koknese, Kokneses novads, LV-5113
4. **Darba izstrādes mērķis:** nodrošināt valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" saglabāšanu un atjaunošanu, izveidojot pils kompleksu par vērtīgu, atraktīvu un interesantu tūrisma galamērķi atbilstoši finanšu nodrošinājumam.

5. Galvenie nosacījumi:

- 5.1. sadalīt izstrādāto un saskaņoto būvprojektu 8 (astoņās) kārtās:
 - 5.1.1. teritorijas ģenerālplāna un skaidrojošā apraksta izmaiņu izstrādāšana, sadalīšana kārtās,
 - 5.1.2. darba organizācijas risinājumi, izdalot atsevišķas kārtas,
 - 5.1.3. ekonomikas daļas, iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkuma, Būvdarbu apjomu saraksta un izmaksu aprēķina sadalīšana kārtās, atbilstoši būvprojekta izmaiņām.
- 5.2. Piedāvātie risinājumi ir jāizstrādā, ievērojot optimālu un ekonomisku finanšu līdzekļu pielietošanu potenciālā projekta realizācijas laikā.
- 5.3. Darbs jāizstrādā atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas valsts standartu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.

7. Darba noformējums


- 7.1. A4 sējuma formāts 4 eksemplāros;
 - 7.2. Plāni uz atsevišķām A3 vai A2 formāta lapām .
 - 7.3. CD, teksti Word doc. formātā, digitālais materiāls CAD (Computer-Aided Design) un pdf formātā.
8. Darba saskaņošanu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā veic Izpildītājs.

PASŪTĪTĀJS


Domes priekšsēdētājs



IZPILDĪTĀJS


B. Eglāja
Valdes priekšsēdētāja





Zemesgrāmatu apliecība

Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļa

Kokneses pagasta zemesgrāmatas nodaļējums Nr. 1000 0011 6961

Kadastra numurs: 3260 013 0507

Nosaukums: Kokneses pilsdrupas

"Kokneses pilsdrupas", Kokneses pag., Kokneses nov.

I.dala 1.iedala

Ieraksta Nr.	Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Kopīpašuma daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3260 013 0507.		1,3142 ha
1.2.	Valsts nozīmes kultūras piemineklis (valsts aizsardzības numurs 1881) - Kokneses viduslaiku pilsdrupas (kadastra apzīmējums 3260 013 0507 001).		
1.3.	Dambji (kadastra apzīmējums 3260 013 0507 002).		
Žurnāls Nr. 300000607821 (10.11.2003), lēmuma datums: 12.11.2003, tiesnesis Inga Zālīte			

II.dala 1. iedala

Ieraksta Nr.	Īpašnieks, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Domājamā daļa	Summa, par kādu iegūts īpašums(Ls)
1.1.	Īpašnieks: Kokneses pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000043494.	1	
1.2.	Pamats: 2003. gada 23. oktobra uzziņa par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Nr.1-13/505, 2002. gada 22. oktobra akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā, 2001. gada 11. decembra akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā, 2003. gada 14. maija Ministru kabineta rīkojums Nr.304.		
Žurnāls Nr. 300000607821 (10.11.2003), lēmuma datums: 12.11.2003, tiesnesis Inga Zālīte			
2.1.	Persona: Kokneses pagasta padome, nodokļu maksātāja kods 90000043494. Īpašuma tiesība izbeigusies.	0	
2.2.	Īpašnieks: Kokneses novada dome, nodokļu maksātāja kods 90000043494.	1	
2.3.	Pamats: 2010.gada 6.jūlija nostiprinājuma lūgums.		
Žurnāls Nr. 300002878880 (14.07.2010), lēmuma datums: 15.07.2010, tiesnesis Iveta Silicka			

III.dala 1. iedaļa

Ieraksta Nr.	Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu	Platība, lielums
1.1.	Atzīme - Daugavas upes 500m aizsargjosla	1,3142 ha
1.2.	Atzīme - Daugavas upes 300m aizsargjosla	1,3142 ha
1.3.	Atzīme - tauvas josla gar upi	
1.4.	Atzīme - tauvas josla gar upi	
1.5.	Pamats: 2003. gada 23. oktobra uzziņa par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Nr.1-13/505.	

Žurnāls Nr. 300000607821 (10.11.2003), lēmuma datums: 12.11.2003, tiesnesis Inga Zālīte

Kancelejas nodeva Ls 9,00 samaksāta

Žurnāla Nr. 300002878880, datums 14.07.2010., lēmuma datums: 15.07.2010.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis:

Zemesgrāmatu apliecība satur nodalījumā
spēkā esošos ierakstus un atzīmes

Iveta Silicka





LATVIJAS REPUBLIKA
AIZKRAUKLES rajona
Kokneses pagasta
Nekustamā īpašuma Kokneses pilsdrupas
Kadastra Nr. – 3260 013 0507

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši:
Kokneses pagasta padomes 2000.g.05.04. sēdes protokola izrakstam Nr. 44 Nr. 6.3.1, Vidusdaugavas
reģ. Nodaļas 2002.g.18.01. lēmumu Nr. 1-3 / 13

Robežu plāns sastādīts pēc 2002.gada uzmērīšanas materiāliem M 1:1000

Zemes kopplatība ir 1.3142 ha /13142m² /

VALSTS ZEMES DIENESTS

VIDUSDAUGAVAS REĢIONĀLĀ NODAĻA

Aizkraukles raj.
Kad.bir. vad.

G.Baiba


29. 01. 2003

Robežpunktu koordinātes
LKS 92 TM koordinātu sistēmā
mēroga koeficients m=0,99969900

Nr.	X	Y
10	278128.81	587030.12
21	278069.59	587048.64
34	278023.87	587101.37
20*	278007.19	587085.60
19*	278000.34	587066.48
18*	278004.90	587058.60
17*	277991.63	587001.03
16*	277991.50	586991.66
15*	277983.32	586979.45
14*	277977.31	586961.06
13*	277963.87	586916.20
12*	277964.28	586910.40
1*	277968.40	586905.47
2*	277975.70	586904.76
3*	277999.16	586919.47
4*	278028.53	586945.44
5*	278034.87	586955.47
6*	278050.01	586969.54
7*	278074.82	586984.35
8*	278100.17	587001.64
9*	278107.50	587010.14

Platība: 1.3142 ha / 13142 m² /

Zemes gabalu Nr.	Kopplatība ha	ZEMES LIETOŠANĀ						
		Lauksaimniecībā izmantojamā zeme	TAJĀ SKAITĀ				Meži	Krūmāji
			Arozme	Augļu dārzi	Pļavas	Gaiņbas		
1.	1.3142							

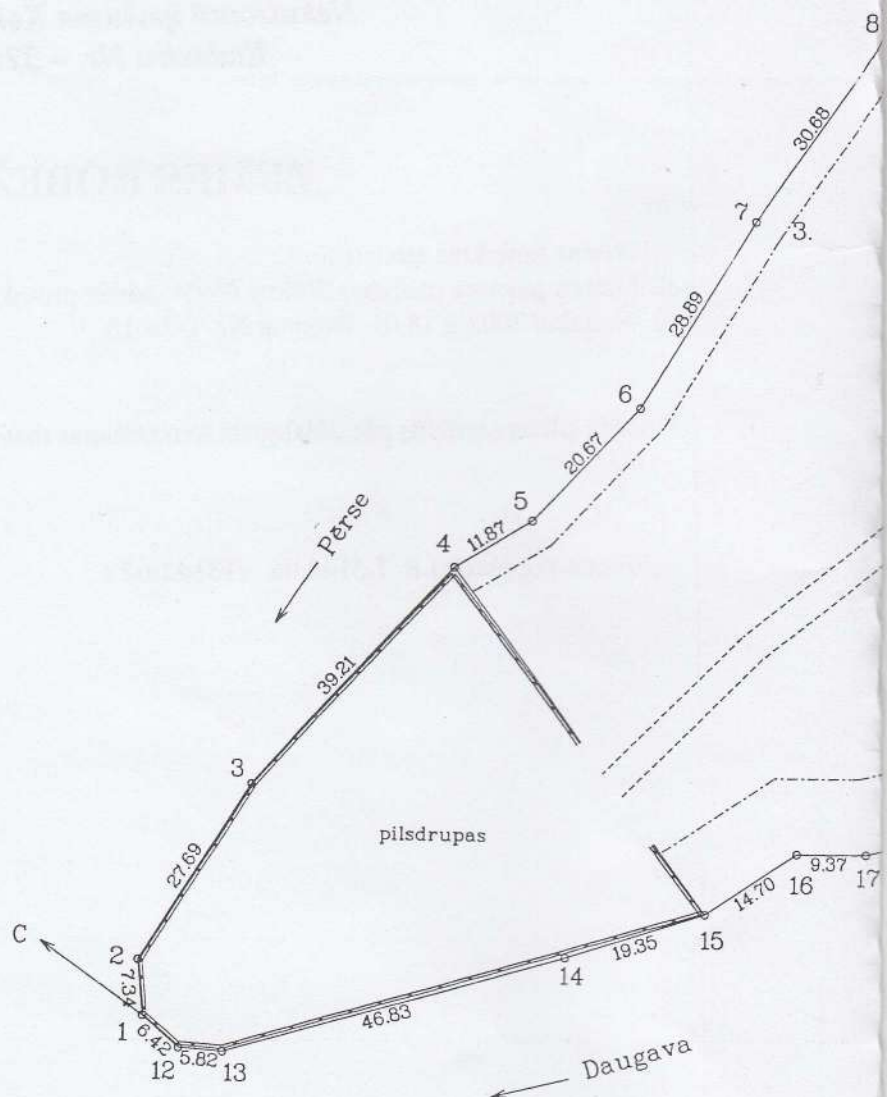

Robežojosās zemes:

No A līdz B Valsts mežs
B - C VRZ Daugavas upe
C - A VRZ Pērses upe



Nekustamā

1.- 01
2.- 01
3. 01
4. 010

* - apvidu nenostiprinātie robežpunkti

kadastraNr. 3260 013 0507

0.2327	Zem ūdeņiem	
	Zem zivju dīkiem	T.sk.
1.0337	Zem ēkām un pagalmiem	
0.0470	Zem ceļiem	
	Pārējās zemes	
	Meliņrēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme	

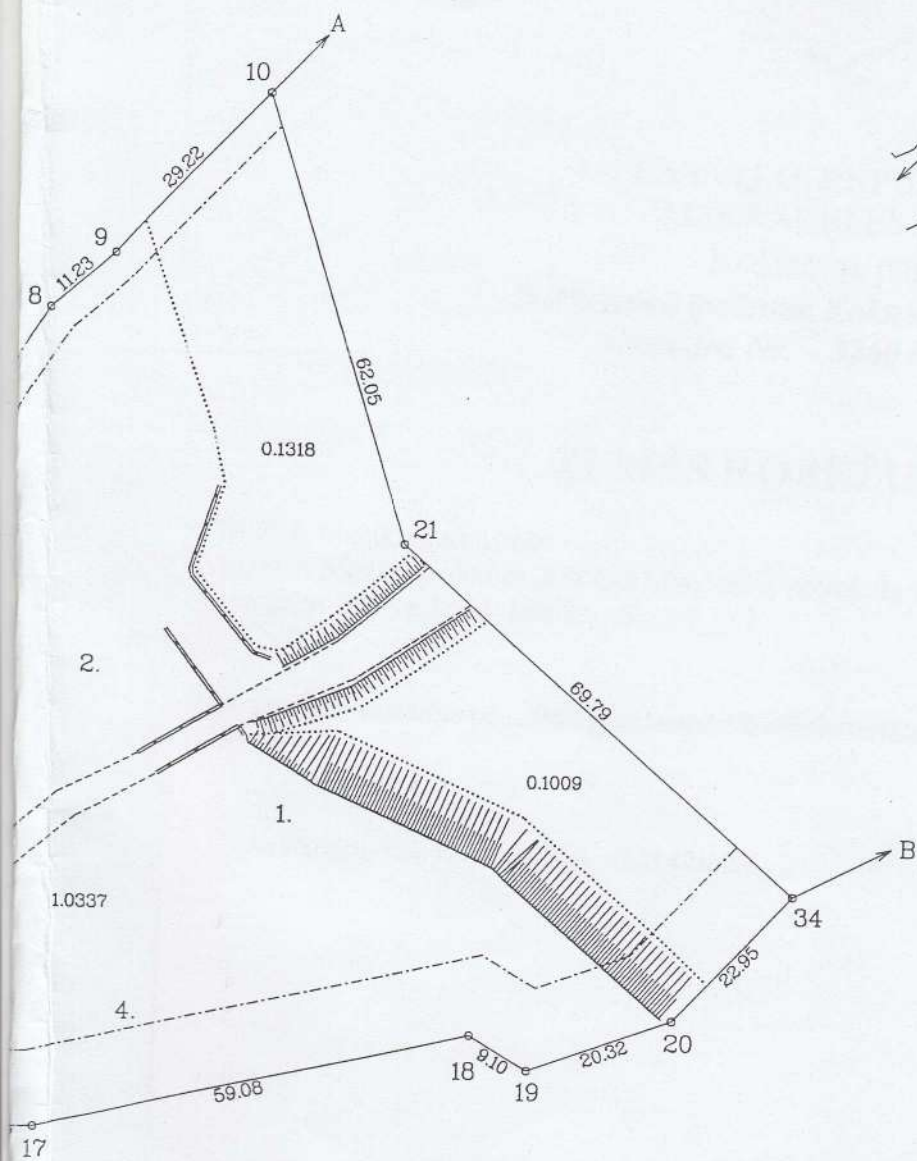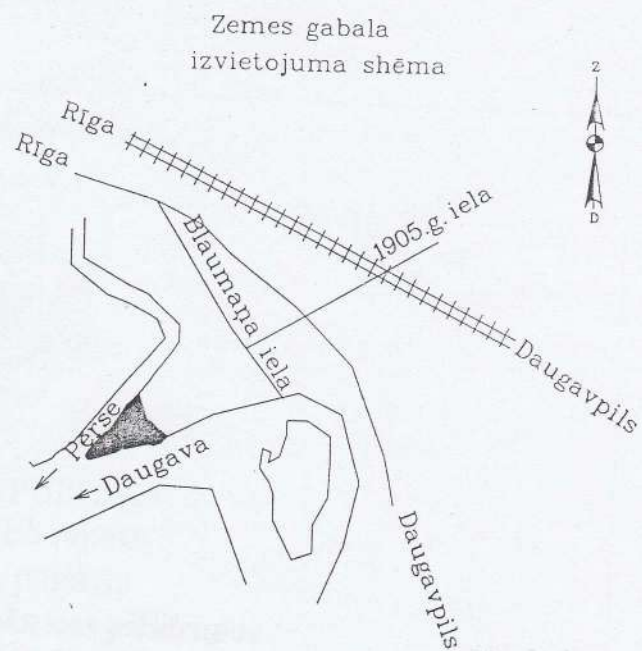

MÉROGS 1 : 1000

VZD Vidusdaugavas reģionālā nodaļa pasūtījumu izpildes pārvalde mērniecības un topogrāfijas daļa			
Vadītāja v.	J. Daugulis		27.01.2003.g.

KONSERVĒJAMĀS PILS DALAS	MŪRA AUGŠDĀLAS PLATĪBA, m2
FASĀDE A, ZIEMELU PUSE	~595 m2
FASĀDE A, DIENVIDU PUSE	~692 m2
SIENA F	~148 m2
FASĀDE G, ZIEMELU PUSE	~560 m2
FASĀDE G, DIENVIDU PUSE	~440 m2
SIENA E; I; ZA	~145 m2
SIENU A UN G GALU PRETSKATI	~178 m2
kopā	~2758 m2
SIENU VIRSLAKNU KONSERVĀCIJA	~613 m2


PROGNOZĒJAMĀS BŪVGRUŽU APJOMS (NODOT PĀRSTRĀDĒ): ~30 m3

1. BŪVES LIETOŠANAS VEIDS: IV
BŪVES UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE: U3 (pēc LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība").
2. KODS PĒC BŪVJU CC KLASIFIKATORA: 1273
3. PROJEKTS PAREDZ KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJAS UN LABIEKĀRTOJUMA DARBUS.
4. BŪVES GRUPA – II (pēc "Vispārīgie būvnoteikumi").

PIEZĪMES

- [1] PAR PAMATU RASĒJUMIEM IZMANTOTI 2016. GADA UZMĒRĪJUMI.
[2] AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.

PROJ. SKATU PLATFORMA-PĀRSEGUMS

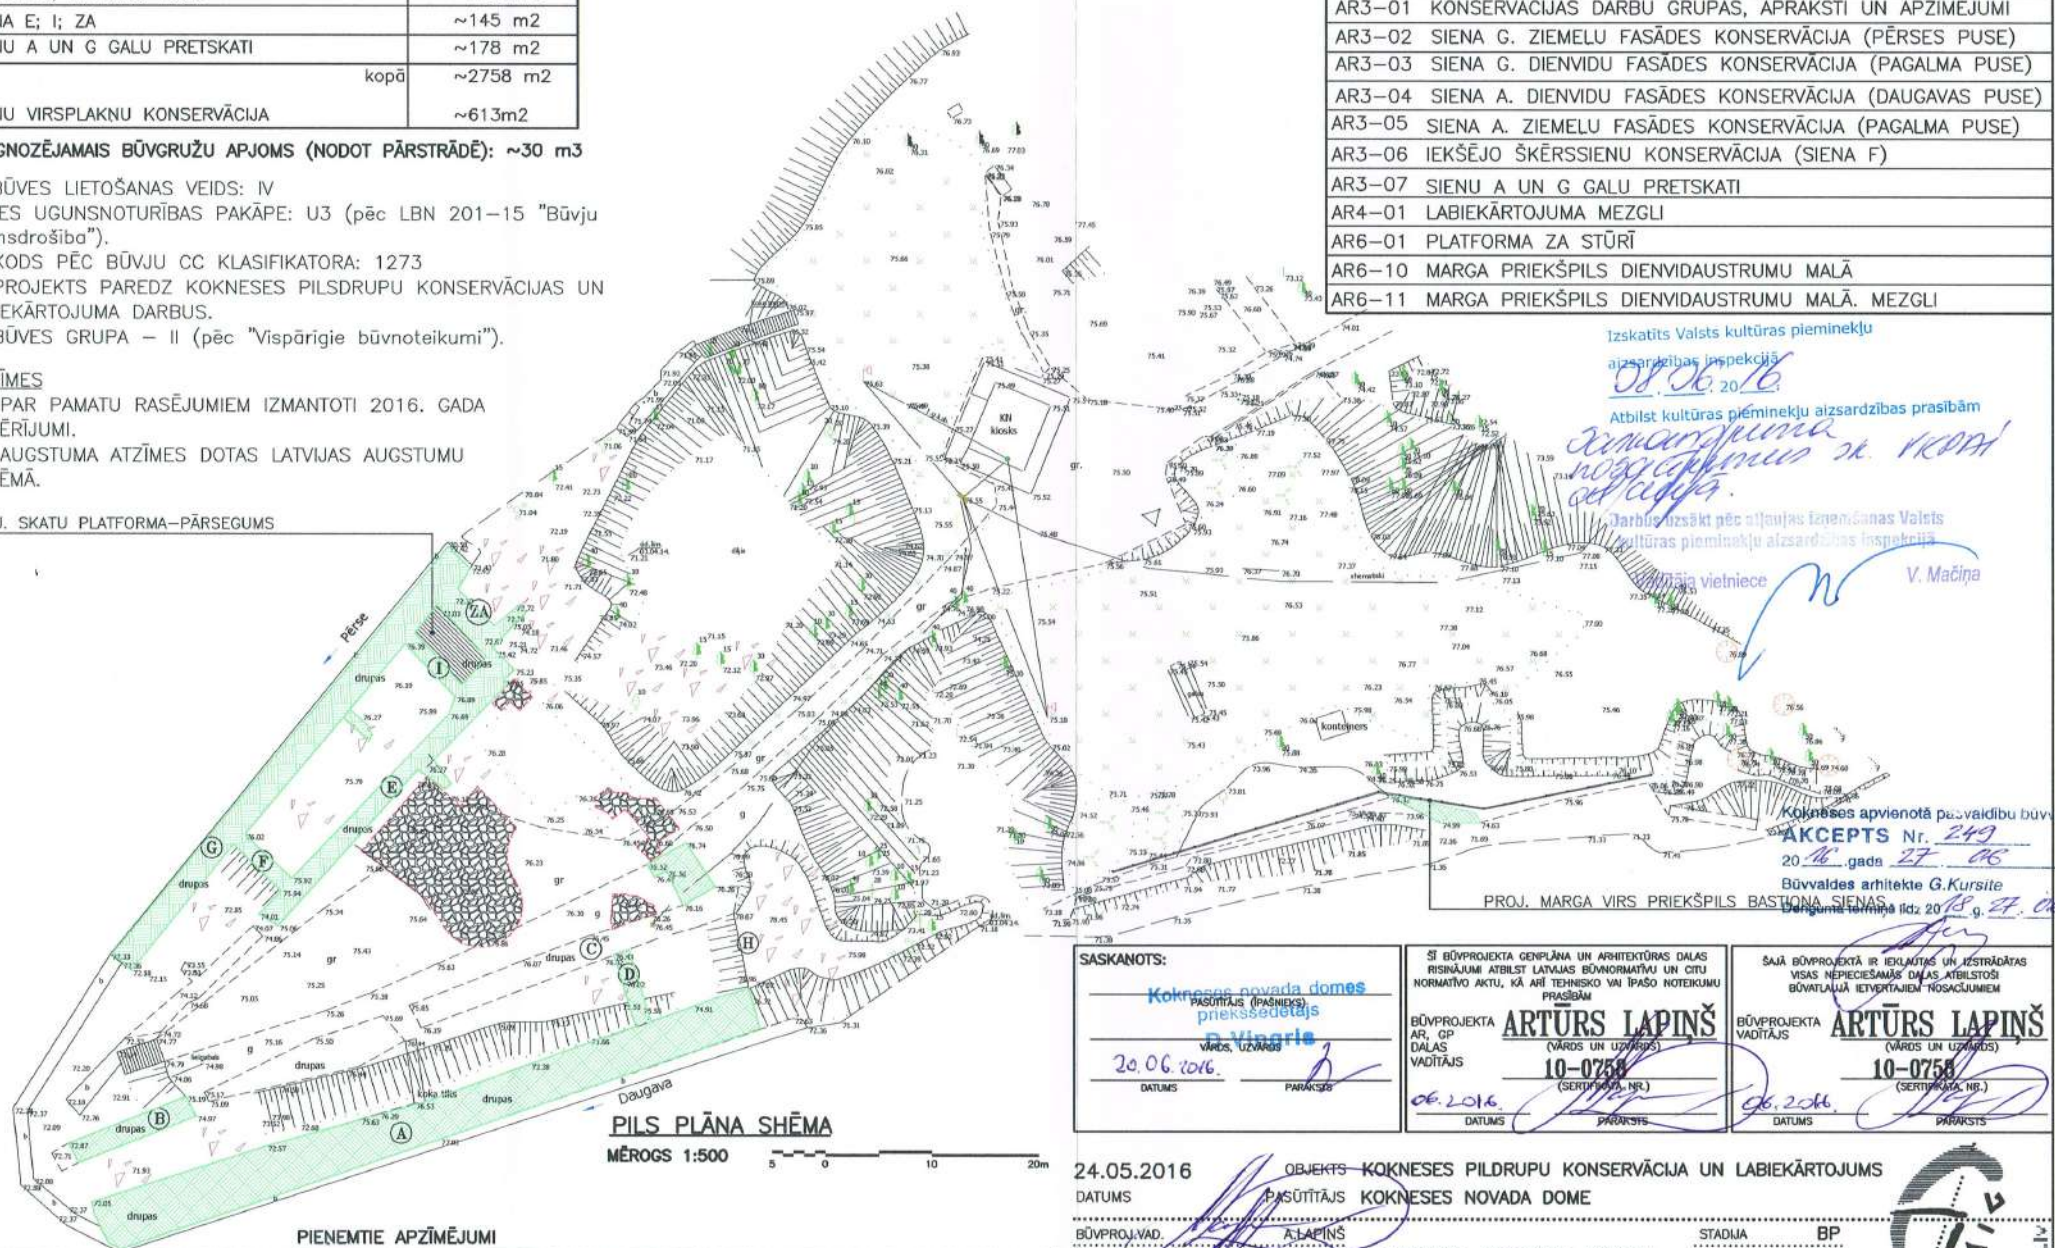

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.	LAPAS NOSAUKUMS
ARHITEKTŪRAS DAĻA	
GP0-01 GENPLĀNS. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. RASĒJUMU SARAKSTS	
AR1-01 PAGALMS. SEGUMU PLĀNS. VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS	
AR3-00 PILSDRUPU PLĀNS ZĀLIENA IESEGŠANAI UZ SIENĀM	
AR3-01 KONSERVĀCIJAS DARBU GRUPAS, APRAKSTI UN APZĪMĒJUMI	
AR3-02 SIENA G. ZIEMELU FASĀDES KONSERVĀCIJA (PĒRSES PUSE)	
AR3-03 SIENA G. DIENVIDU FASĀDES KONSERVĀCIJA (PAGALMA PUSE)	
AR3-04 SIENA A. DIENVIDU FASĀDES KONSERVĀCIJA (DAUGAVAS PUSE)	
AR3-05 SIENA A. ZIEMELU FASĀDES KONSERVĀCIJA (PAGALMA PUSE)	
AR3-06 IEKŠĒJO ŠKĒRSIENU KONSERVĀCIJA (SIENA F)	
AR3-07 SIENU A UN G GALU PRETSKATI	
AR4-01 LABIEKĀRTOJUMA MEZGLI	
AR6-01 PLATFORMA ZA STŪRĪ	
AR6-10 MARGA PRIEKŠPILS DIENVIDAUSTRUMU MALĀ	
AR6-11 MARGA PRIEKŠPILS DIENVIDAUSTRUMU MALĀ. MEZGLI	

Izskatīts Valsts kultūras pieminekļu

aizsardzības inspekcijā

20.06.2016

Atbilst kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

Arhitekta projekta izstrādātājs

SASKANOTS:

Kokneses novada domes

PASŪTĪTĀJS (PĀRŠĒDĒTĀJS)

P. Vīnars

20.06.2016

DATUMS

PĀRŠĒDĒTĀJS

ŠĀ BŪVPROJEKTA GENPLĀNA UN ARHITEKTŪRAS DAĻAS

RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU

NORMATĪVO AKTU, KĀ ĀRI TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU

PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA

AR, GP

DALAS

VADĪTĀJS

ARTŪRS LAPINŠ

(VĀRDS UN UZVārds)

10-0758

(CERTIFIKĀTĀ NR.)

06.2016

DATUMS

PĀRŠĒDĒTĀJS

ŠĀ BŪVPROJEKTA IR IEKĻAUTS UN IZSTRĀDĀTS

VISAS NEPIECESAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI

BŪVATĻĀJĀ IETVERTĀJĀM NĒSĀCĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA

VADĪTĀJS

ARTŪRS LAPINŠ

(VĀRDS UN UZVārds)

10-0758

(CERTIFIKĀTĀ NR.)

06.2016

DATUMS

PĀRŠĒDĒTĀJS

24.05.2016

DATUMS

PĀRŠĒDĒTĀJS

BŪVPROJ.VAD.

ARHITEKTS

ARHITEKTS

ARHITEKTS

OBJEKTS KOKNESES PILDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS

PĀRŠĒDĒTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

PĀRŠĒDĒTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

PĀRŠĒDĒTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

PĀRŠĒDĒTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

PĀRŠĒDĒTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

PĀRŠĒDĒTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

GENPLĀNS. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.

RASĒJUMU SARAKSTS

STADIJA BP

MARKA GP

MĒROGS 1:500

PAS.NR. 2.1.-6.2./18 LAPA(S)

0-01 IZM. 0



www.AIG

sta.lv



Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīga

17.06.2016. Nr.11-03/1900

Uz 10.05.2016 iesniegumu b/n

(reģ.10.05.2016 Nr.3175);

Uz 30. 05.2016 Nr.82/01 – 15

(reģ.30.05.2016 Nr.3710);

Uz 02.06.2016 iesniegumu b/n

(reģ.02.06.2016 Nr.3808)

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”

Reģ.Nr.40003041528

Arsenāla ielā 3

Rīgā, LV 1050

*Par objektu ““Kokneses viduslaiku pilsdrupas” konservācija un labiekārtojuma darbi
Kokneses pagastā, Kokneses novadā”*

1. Iesniedzējs:

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, reģ.Nr.40003041528, adrese: Arsenāla iela 3, Rīga.

2. Paredzētā darbības vieta:

Kokneses pilsdrupas un to teritorija (kadastra apzīmējums – 3260 013 0507 001)
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

3. Iesniedzēju prasījums:

Izsniegt atļauju Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtojuma darbiem
saskaņā ar iesniegto dokumentāciju.

4. Konstatētie apstākļi:

4.1. Objekts ir valsts nozīmes arhitektūra piemineklis “Kokneses pilsdrupas” (valsts
aizsardzības Nr.6160), kā arī valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis “Kokneses
viduslaiku pils un senpilsēta” (valsts aizsardzības Nr.118).

4.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija)
Būvniecības ieceru izvērtēšanas komisijas 18.05.2016, 25.05.2016, 01.06.2016,
06.06.2016 un 08.06.2016 sēdēs izskatīta iesniegtā un Inspekcijas rīcībā esošā

dokumentācija un risinājumi atbalstīti ar nosacījumiem. Inspekcijas atļaujas saņemšanai iesniedzama papildus informācija par darbu izpildītājiem.

5. Lēmuma pamatojums:

5.1. Uz objektu attiecas likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", kā arī no tā izrietošo Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" (turpmāk – Noteikumi Nr.474) prasības.

5.2. Noteikumu Nr.474 56.punkts nosaka, ka kultūras pieminekļa restaurācijas, rekonstrukcijas, remonta un konservācijas darbus drīkst veikt tikai kompetenta speciālista vadībā. Fizisko un juridisko personu kompetenci apliecina attiecīga licence vai sertifikāts restaurācijas darbu veikšanai.

6. Lēmums:

Atbalstīt Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservāciju un labiekārtojuma darbus saskaņā ar 02.06.2016 iesniegto dokumentāciju ar nosacījumiem, kas risināmi autoruzraudzības kārtībā:

6.1. ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītu darbu laikā jānodrošina arheoloģiskā izpēte (uzraudzība un/vai izrakumiem);

6.2. vēsturisko bruģi atjaunot atbilstoši arheoloģiskās izpētes secinājumiem; saglabājamās oriģinālās bruģa konstrukcijas;

6.3. akas namiņu pēc iespējas atjaunot tā, lai tas nebūtu dominējošais elements.

Inspekcijas atļaujas saņemšanai iesniegt Noteikumu Nr.474 53.punktā minēto informāciju:


53.3. darbu izpildītājs (uzņēmējs) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir), juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir));

53.4. uzņēmēja norīkots darbu vadītājs (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta vai restaurācijas apliecības numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir));

53.5. īpašnieka norīkota par darbu uzraudzību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir)).

Inspekcijas vadītāja vietniece

V.Mačiņa





Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīga

20.07.2017. Nr.11-02/3509

Uz 30.06.2017 iesniegumu b/n

(reģ.30.06.2017 Nr.4891)

SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

aig@aigsia.lv

Par objekta "Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi Kokneses pagastā, Kokneses novadā" būvprojekta izmaiņām

1. Iesniedzējs:

SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa", reģ.Nr.40003041528, adrese: Arsenāla iela 3, Rīga.

2. Paredzētā darbības vieta:

Kokneses pilsdrupas un to teritorija (kadastra apzīmējums – 3260 013 0507 001) Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

3. Iesniedzēja prasījums:

Izsniegt atļauju Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbiem, būvprojekta izmaiņām.

4. Konstatētie apstākļi:

4.1. Objekts ir valsts nozīmes arhitektūra piemineklis "Kokneses pilsdrupas" (valsts aizsardzības Nr.6160), kā arī valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis "Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta" (valsts aizsardzības Nr.118).

4.2. Dokumentācija izskatīta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) Būvniecības ieceru izvērtēšanas komisijas 05.07.2017 sēdē un konstatēts:

4.2.1. 17.06.2016 Inspekcija Iesniedzējam ir nosūtījusi lēmumu Nr.11-03/1900, atbalstot "Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservāciju un labiekārtojuma darbus saskaņā ar 02.06.2016 iesniegto dokumentāciju ar nosacījumiem, kas risināmi autoruzraudzības kārtībā: 6.1. ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītu darbu laikā jānodrošina arheoloģiskā izpēte (uzraudzība un/vai izrakumiem);

6.2. vēsturisko bruģi atjaunot atbilstoši arheoloģiskās izpētes secinājumiem; saglabājamās oriģinālās bruģa konstrukcijas;

6.3. akas namiņu pēc iespējas atjaunot tā, lai tas nebūtu dominējošais elements".

Vienlaicīgi Iesniedzējs informēts, ka Inspekcijas atļaujas saņemšanai iesniedzama Noteikumu Nr.474 53.punktā minētā informācija:

53.3. darbu izpildītājs (uzņēmējs) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir), juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir));

53.4. uzņēmēja norīkots darbu vadītājs (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta vai restaurācijas apliecības numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir));

53.5. īpašnieka norīkota par darbu uzraudzību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir)).

4.2.2. 30.06.2017 iesniegtajā dokumentācijā uzrādīta projekta sadalīšana kārtās, pret ko Inspekcijai nav iebildumu.

5. Lēmuma pamatojums:

5.1. Uz objektu attiecas likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kā arī no tā izrietošo Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.474) prasības.

5.2. Noteikumu Nr.474 56.punkts nosaka, ka kultūras pieminekļa restaurācijas, rekonstrukcijas, remonta un konservācijas darbus drīkst veikt tikai kompetenta speciālista vadībā. Fizisko un juridisko personu kompetenci apliecina attiecīga licence vai sertifikāts restaurācijas darbu veikšanai.

6. Lēmums:

Piekrīst objekta “*Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi Kokneses pagastā, Kokneses novadā*” būvprojekta izmaiņām, kas paredz projekta sadalīšanu kārtās, paturot spēkā Inspekcijas lēmuma Nr.11-03/1900 (17.06.2016) nosacījumus.

Saskaņošanas vai rakstiska atzinuma gadījumā Inspekcija patur vienu iesniegtās dokumentācijas eksemplāru.

Inspekcijas vadītāja vietniece

(*paraksts)

K.Kukaine

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

KOKNESES NOVADA DOME

Reģ.Nr.LV90000043494


Melioratoru iela 1, Koknese

Kokneses novads, LV- 5113

Rīgā, 2017. gada 20.jūnijā

APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinām, ka SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" izsniegtās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises Nr.604802504 ar Atbildības limitu EUR 264 000,00 un darbības termiņu no 03.03.2017. līdz 02.03.2018. (pagarinātais ziņošanas periods -03.03.2020.) segumā ir profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības riski Latvijas Republikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.502., tai skaitā ir apdrošināts būvprojekta vadītājs, arhitekts: **Artūrs Lapiņš** (pers.kods 210871-11806) un objekts "**Kokneses pilsdrupu teritorijas attīstības būvprojekta sadalīšanu kārtās**", apdrošinātā darbība – sadalīt izstrādāto un saskaņoto būvprojektu objektam "**Kokneses pilsdrupas**" **Koknesē, Kokneses novadā**, Latvijas teritorijā, saskaņā ar Līgumu.


Vita Lūciņa
AAS Balta

Brokeru apkalpošanas grupas vadītāja



APRAKSTS PAR PROJEKTA DALĪŠANU KĀRTĀS

1. I E V A D S

1.1. VISPĀRĪGI

Valsts kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" konservācijas darbu un labiekārtošanas darbu būvprojekts izstrādāts SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" projektu grupā 2016.gadā saskaņā ar Kokneses novada domes pasūtījumu (pasūtījuma Nr. 2.1.-6.2./18). Būvprojekta akcepts būvvaldē Nr.249, 27.06.2016. MBP stadijai; projektēšanas nosacījumi izpildīti 09.01.2017.

Atbilstoši Pasūtītāja lūgumam (pasūtījuma Nr.2017-032, datums 25.05.2017.), akceptētais būvprojekts sadalīts 8 kārtās, katrai kārtai nodrošinot atsevišķu būvlaukumu.

2. P R O J E K T A K Ā R T A S

2.1. 1. KĀRTA

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 1. kārtas darbi –

"Mūra sienu galu "A" (sienai G) un "D" (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi" (lokālā tāme Nr.8).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā būvprojekta realizācijas.

2.2. PĀRĒJAIS PROJEKTS

Pārējā būvprojekta realizācija – 2.kārtas, 3.kārtas, 4.kārtas, 5.kārtas, 6.kārtas, 7.kārtas un 8.kārtas darbi nav savstarpēji saistīti, un ir veicami netkarīgi no Būvprojekta 1. kārtas darbiem.

2. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 2. kārtas darbi –

"Mūra sienu galu "B" (sienai G) un "C" (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi" (lokālā tāme Nr.8).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā būvprojekta realizācijas.

3. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 3. kārtas darbi, kuros ietilpst:

* Mūra sienas "G" ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi (lokālā tāme Nr.2) [Pērses puse];

* Mūra sienas "A" dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi (lokālā tāme Nr.4) [Daugavas puse];

* Labiekārtošanas darbi (lokālā tāme Nr.9).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā būvprojekta realizācijas.

4. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 4. kārtas darbi –

"Mūra sienas "G" dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi" (lokālā tāme Nr.3) [pagalma puse].

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā būvprojekta realizācijas.

5. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 5. kārtas darbi –

"Mūra sienas "A" ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi (daļa darbu no lokālās tāmes Nr.5)" [pagalma puse].

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā būvprojekta realizācijas.

6. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 6. kārtas darbi –

"Mūra sienas "A" ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi (daļa darbu no lokālās tāmes Nr.5)" [pagalma puse].

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā būvprojekta realizācijas.

7. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 7. kārtas darbi –

"Mūra sienas "F" ziemeļu un dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi" (lokālā tāme Nr.6).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā būvprojekta realizācijas.

8. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 8. kārtas darbi –

"Mūra sienu "E", "I" un "ZA" fasāžu konstrukciju konservācijas darbi" (lokālā tāme Nr.7).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā būvprojekta realizācijas.

Būvprojekta vadītājs, Arhitekts: Artūrs Lapiņš
(sert. Nr. 10-0758)

2017. gada 9. jūnijs

Projekts: Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi
 Adrese: "Kokneses pilsdrupas", Kokneses novads
 Pasūtītājs: Kokneses novada dome
 Projekta stadija: Būvprojekts - IZMAIŅAS
 Sējuma Nr. **1.1. ĢP, DOP, BA.**
Ģenerālpāns, Darbu organizēšanas projekts, Būvdarbu apjomu saraksts

IZMAIŅU RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr.	Lapas nosaukums	Izmaiņas datums	Izmaiņas nr.
GP 0-01	Ģenerālpāns. Vispārīgie rādītāji. Rasējumu saraksts	02.06.2017.	2
DOP 1-01-1	Būvdarbu ģenerālpāns. 1.kārtas darbi	02.06.2017.	2
DOP 1-01-2	Būvdarbu ģenerālpāns. 2.kārtas darbi	02.06.2017.	2
DOP 1-01-3	Būvdarbu ģenerālpāns. 3.kārtas darbi	02.06.2017.	2
DOP 1-01-4	Būvdarbu ģenerālpāns. 4.kārtas darbi	02.06.2017.	2
DOP 1-01-5	Būvdarbu ģenerālpāns. 5.kārtas darbi	02.06.2017.	2
DOP 1-01-6	Būvdarbu ģenerālpāns. 6.kārtas darbi	02.06.2017.	2
DOP 1-01-7	Būvdarbu ģenerālpāns. 7.kārtas darbi	02.06.2017.	2
DOP 1-01-8	Būvdarbu ģenerālpāns. 8.kārtas darbi	02.06.2017.	2

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI
[1] MĒRI RASĒJUMOS DOTI MILIMETROS.
[2] PIRMS JEBKURU DARBU UZSĀKŠANAS UZNĒMĒJAM JĀPĀRLIECINĀS PAR RASĒJUMOS SNIEGTAJIEM IZMĒRIEM. JA PROJEKTA RISINĀJUMOS TIEK ATKLĀTAS NEATBILSTĪBAS VAI PRETRUNAS, PAR TĀM SAVLAICĪGI JĀINFORMĒ ŪVPROJEKTA AUTORS UN TĀS JĀNOVĒRŠ.
[3] IZMĒRUS BŪVPROJEKTĀ NENOLASĪT MĒROGĀ.
[4] DETALIZĒTAS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMUS SKATĪT ATBILSOŠOS RASĒJUMOS.
[5] IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI RASĒJUMOS DOTI NOSACĪTI.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS
[1] BŪVNIECĪBAS LIKUMS.
[2] MK NOTEIKUMI NR.500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI".
[3] MK NOTEIKUMI NR.529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI".
[4] LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 202–15 "BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA".
[5] LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 201–15 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA".
[6] LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 206–14"KOKA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA".
[7] LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 204–14 "TĒRAUDA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA".
[8] LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 003–15 "BŪVKLIMATOLOĢIJA",
[9] MK NOTEIKUMI NR.474 "NOTEIKUMI PAR KULTŪRAS PIEMINEKĻU UZSKAITI,
AIZSARDZĪBU, IZMANTOŠANU, RESTAURĀCIJU UN VIDĒI DEGRADĒJOŠĀ OBJEKTA STATUSA PIEŠKIRŠANU".
[10] LAPINŠ A. KOKNESES PILS ATTĪSTĪBAS METS. RĪGA, "ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA" SIA, 2016.
EKVIVALENTU MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZMANTOŠANA
VISAS ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IEKĀRTU RAŽOTĀJIEM, KURI NORĀDĪTI BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO RAŽOJUMU TEHNISKO, ESTĒTISKO KVALITĀTI UN EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBĀM. BŪVPROJEKTA RASĒJUMOS UN SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTOS MATERIĀLUS UN IEKĀRTAS IR IESPĒJAMS AIZSTĀT AR CITIEM:
1) JA TIE IR TEHNISKI, ESTĒTISKI UN ENERGOIETILPĪGI EKVIVALENTI UN TO EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS NAV AUGSTĀKAS PAR PROJEKTĀ POAREDZĒTO PIEMĒRU EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSĀM;
2) JA NETIEK PAZEMINĀTA BŪVPROJEKTĀ PAREDZĒTĀ TEHNISKO UN ESTĒTISKO RISINĀJUMU KVALITĀTE, PAAUGSTINĀTA ENERGOIETILPĪBA, NETIEK SADĀRDZINĀTS BŪVNIECĪBAS PROCESS, BŪVES UN INŽENIERTEHNISKĀ APRIKOJUMA EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMI.

MATERIĀLI SPECIFIKĀCIJĀS DOTI IEBŪVĒTĀ VEIDĀ BEZ ATGRIEZUMIEM U.C. NORMATĪVAJIEM ZUDUMIEM.

PIEZĪMES
[1] PAR PAMATU RASĒJUMIEM IZMANTOTS 2016. GADA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS (PLĀNA KOPIJU SKAT. PROJEKTA PIELIKUMĀ).
[2] AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
[3] ATSEVIŠĶU ELEMENTU GRAFISKIE APZĪMĒJUMI KOPĀ AR VEICAMO DARBU APJOMIEM, PIEZĪMĒM UN NORĀDĪJUMIEM DOTI ATBILSTOŠOS RASĒJUMOS.

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

PILSDRUPU MŪRU KONSERVĀCIJA

PAGALMA BRUGA PĀRBŪVE (REKONSTRUKCIJA) UN RESTAURĀCIJA

PILS KORPUSU MŪRA SIENU APZĪMĒJUMI

RASĒJUMU REVĪZIJU (IZMAINU) VIETAS

PROJEKTA KĀRTAS NR.

BŪVNIECĪBAS RADĪTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
1. PAREDZAMĀIS BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU DAUDZUMS ~30 M3.
2. BŪVNIECĪBAS ATKRITUMI NODODAMI PĀRSTRĀDEI, PAMATOJOTIES UZ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LIKUMA PRASĪBĀM.
3. IESNIEGT PASŪTĪTĀJAM APLIECINĀJUMU PAR NOSLĒGTIEM PAKALPOJUMU LĪGUMIEM PAR BŪVNIECĪBAS LAIKĀ RADĪTO ATKRITUMU SAVĀKŠANU, PĀRKRAUŠANU UN NODOŠANU.
PROJEKTA APRAKSTS
[1] PROJEKTĀ RISINĀTA KOKNESES PILSDRUPU VIRSZEMES DALU KONSERVĀCIJA, BRĪVDABAS EKSPOZĪCIJU TELPAS IEKĀRTOŠANA ZIEMEĻAUSTRUMU STŪRĪ, KĀ ĀRĪ DAĻĒJUS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBUS.
[2] BŪVES KODS PĒC CC KLASIFIKATORA: 1273
[3] BŪVES GRUPA – III (pēc "Vispārīgie būvnoteikumi").
[4] BŪVES LIETOŠANAS VEIDS: IV; BŪVES UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE: U3 (ATBILSTOŠI LBN 201–15 "Būvju ugunsdrošība").

GĀLVENO KONSTRUKCIJU APRAKSTS
– PAMATI – ESOŠI MAŠĪVU DOLOMĪTAKMĒNU, LENTVEIDA.
– SIENAS – ESOŠAS, MONOLĪTU DOLOMĪTAKMĒNU,
– PĀRSEGUMS – NAV SAGLABĀJIES; JAUNS KOKA PĀRSEGUMS – PLATFORMA PILS ZA TELPAI.

BŪVNIECĪBĀ NEPIECIEŠAMIE BŪVIZSTRĀDĀJUMI (DETALIZĒTU BŪVIZSTRĀDĀJUMU APRAKSTU SKAT. RASĒJUMU LAPĀS)
[1] VIRSMAS SEGUMI: DABĪGA, IESPĒJAMI TUVU OBJEKTAM IEGŪTA VELĒNA UZ MĀĻA SLĀNA, CELINIEM UN LAUKUMIEM ARHEOLOĢISKĀS IZSIJAS;
[2] MŪRU FASĀDES PLAKNES KONSERVĀCIJA: KALKU (AKTIVITĀTE >95%) – GRANTS (GRANULOMETRIJA ANALOGA ESOŠAI) JAVA AR >6% PORTLANCEMĒNTA PIEDEVU;
[3] VIRSMAS AIZSARADZĪBA: SILIKĀTU BĀZES HIDROFOBS (AQUA POROSIL);
[4] BRUGA MATERIĀLS: GRANĪTA LAUKAMENS, IZMĒRI 6.15CM, ANALOGS ESOŠAJAM.
[5] KONSTRUKCIJĀM IZMANTOT ANTISEPTIZĒTU MAŠĪVU GAISSAUSU PRIEDES KOKMATERIĀLU (ĒVELĒTU) AR KOKSNES MITRUMA SATURU 18%±3%. ANTISEPTIKA TONI SKAT. LAPĀ AR6–01.
[6] PLATFORMAS GRĪDA – ĒVELĒTS LAPEGLES DĒĻU KLĀJS.
[7] ATJAUNOTS MŪRIS: UZ VIETAS OBJEKTĀ ESOŠI DOLOMĪTAKMĒNI, ATLASĪTI UN ATTĪRĪTI; IZMĒRS PIESKANOTS ESOŠAJAM MŪRIM.

SADALĪJUMS KĀRTĀS
PROJEKTS TIEK DALĪTS KĀRTĀS. SKAT. SKAIDROJOŠĀ APRAKSTA LAPU "APRAKSTS PAR PROJEKTA DALĪŠANU KĀRTĀS". KĀRTU GRAFISKU ATTĒLOJUMU SKAT. ŠAJĀ LAPĀ.

PROJ. MARGA VIRS PRIEKŠPILS BASTIONA SIENAS
SKAT. AR6–10, T.SK. AUGSTUMU ATZĪMES

GENERĀLPLĀNS

MĒROGS 1:500

PIEZĪMES:
1. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.9996926
2. Latvijas normālo augstu sistēma (LAS-2000.5)
3. Uzmēršana veikta 2016.gada 2.jūnijā, uzņēmni 1,54ha.
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
5. Uzmēršanā izmantoti ar LatPos korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalstpunkti:
Nr.1000, X=278005.772, Y=587038.916, H=76.300
Nr.1001, X=278054.702, Y=586991.088, H=75.584
Nr.1002, X=278005.578, Y=586955.161, H=76.613
Nr.1003, X=277980.372, Y=586934.054, H=76.784
6. Bāzes stacijas - Jēkabpils (JEK1), Lielvārde (LIELV)
7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281, 1.pielikumam.
8. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 16.06.2016. Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv (datne 291147.edoc). Saskaņā ar VZO sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmēršanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

SASKANAOTS:

PASŪTĪTĀS (PĀŠNEKS)

VĀRDS, UZVĀRDS

DATUMS

PARAKSTS

02.06.2017

DATUMS

BPV/BŪVPR.D.VAD.

ARHITEKTS

OBJEKTS KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS

PASŪTĪTĀS KOKNESES NOVADA DOME

LAPU SKAITS 16

STADIJA BP

MARKA GP

MĒROGS 1:500

PAS.NR. 2017-032 LAPA(S) 0-01 IZM. 2

SAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DALIS ATBILSTOŠI BŪVĀTLAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

ARTŪRS LAPINŠ
(VĀRDS UN UZVĀRDS)
10-0758
(SERTIFIKĀTA NR.)

DATUMS

PARAKSTS

ŠĒ BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNA UN ARHITEKTŪRAS DALIS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ĀRĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA AR, GP DALIS VADĪTĀJS

ARTŪRS LAPINŠ
(VĀRDS UN UZVĀRDS)
10-0758
(SERTIFIKĀTA NR.)

DATUMS

PARAKSTS

SĀSKANAOTS
ar akciju sabiedrības
«Latvijas Gāze»
I.Klauzē
2016.g.06.02.

SALĪDZINĀTS
ar akciju sabiedrības
«Latvijas Gāze»
TEHNISKĀ IECIRKŅA
TEHNISKĀ ARHĪVA DATIEM
AS «Latvijas Gāze»
Jēkabpils reģionālā mēroga
MĒROGS 1:500
2016.g.06.02.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epocha 2000.5 (LAS-2000.5). Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

DKM

Reģistrācijas Nr.45403015418

Sertificētais mērnieks Ģirts Kaminskis (sert.Nr.BC314 derīgs no 17.02.2011. līdz 16.02.2016.)

Aizkraukle, Jaunceltnes iela 1a

Tālr. 28625896

Valdes priekšsēdis J.Daugulis 16.05.2016.

Mērmnieks Ģ.Kaminskis 02.06.2016.

Plānu zīmētājs Ģ.Kaminskis 10.06.2016.

Pasūtījums "Kokneses pilsdrupas"

Kokneses pagasts, Kokneses novads

Pasūtītājs SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

Pasūtījuma reģistrācijas Nr. KT 2016-25

Topogrāfiskais plāns

Mērogs 1:500

Lapas 1

Lapa 1.

2

PROJEKTA DALĪJUMS KĀRTĀS (PĒC PASŪTĪTĀJA LŪGUMA)

02.06.2017.

1

BŪVES GRUPA (PĒC BŪVVALDES PIEZĪMES); NOFORMĒJUMA KOREKCIJAS PĒC BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES

17.10.2016.

Nr

IZMAINAS APRAKSTS

DATUMS

BPV/BŪVPR.D.VAD.

ARTŪRS LAPINŠ

ARHITEKTS

A.LAPINŠ

GENERALPLĀNS. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPU SKAITS 16

STADIJA BP

MARKA GP

MĒROGS 1:500



PAS.NR. 2017-032 LAPA(S) 0-01 IZM. 2

ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES



ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES

1.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienu galu "A" (sienai G) un "D" (sienai A)
fasādes konstrukciju konservācijas darbi

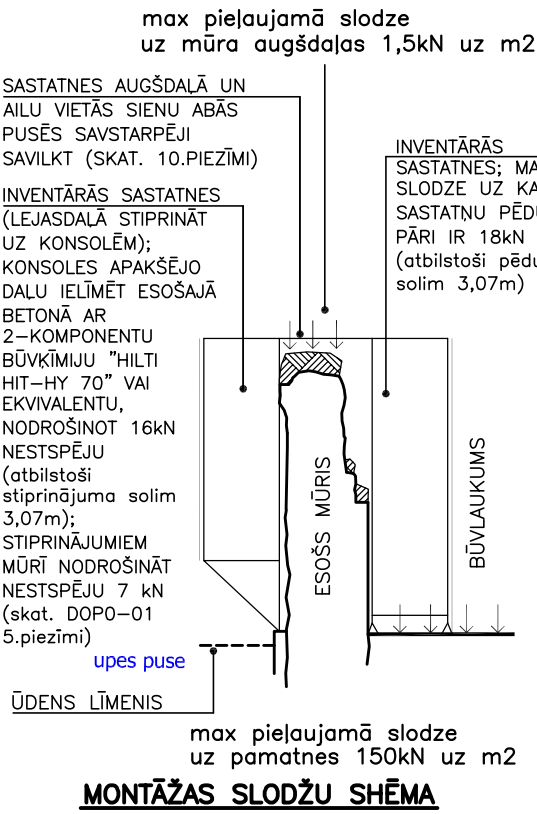

PROJ. SKATU PLATFORMA KOKA KONSTRUKCIJĀS (SKAT. LAPĀ DOP 1-10 "3.KĀRTAS DARBI")

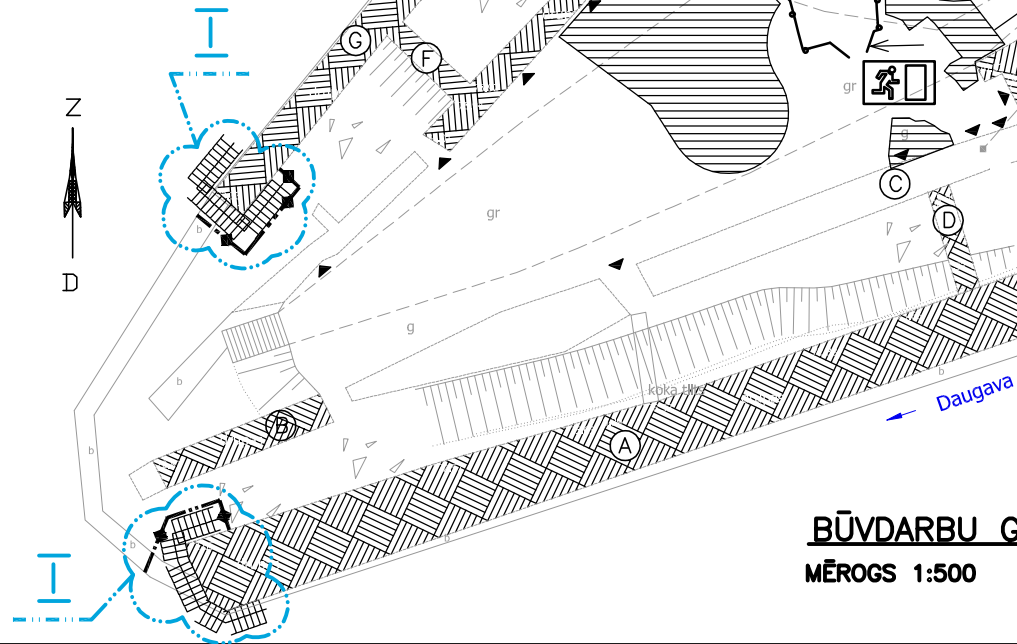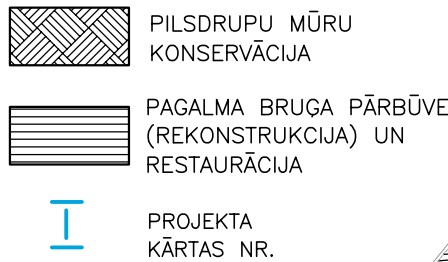

- PIEZĪMES:**
- [1] RASĒJUMAM PAR PAMATU IZMANTOTS 2016.G. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
- [2] PROJEKTA IETVAROS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS UN SAGATAVOŠANAS DARBIEM NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS SKAT. ŠAJĀ LAPĀ.
- [3] NORĀDĪJUMUS PAR BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANU UN BŪVDARBU VEIKŠANU SKATĪT DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ.
- [4] IZMANTOJAMAS SASTATNES, KURAS ATBILST LR MK NOTEIKUMIEM NR. 526 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU UN STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ". NEPIECIEŠAMA 2. SASTATNU KLASĒ AR EJAS PLATUMU 700 MM (KLĀJA MAX NOSLODZE 1,5kN/M2).
- [5] PIRMS SASTATNU MONTĀŽAS NOSEGT ESOŠO SEGUMU AP PILSDRUPĀM.
- [6] NOROBEŽOJOŠO ŽOGU AIZKLĀT AR NECAURSPĪDĪGU MATERIĀLU.
- [7] BŪVLAUKUMĀ ŪDENSAPGĀDE PAREDZĒTA NO DAUGAVAS.
- [8] UZ OBJEKTAM PIEGULOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSLĒGARMATŪRĀM UN KONTROLAKĀM AIZLIEGTS IZVIETOT GRŪTI PĀRVIETOJAMUS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA ELEMENTUS (BŪVGRUŽU KONTEINEINERUS U.C.).
- [9] BŪVPROJEKTĀ BŪVDARBUS IESPĒJAMS SADALĪT ETAPOS, IEVĒROJOT GALVENOS DARBA ORGANIZĀCIJAS PRINCIPUS, KAS NORĀDĪTI SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ UN ŠAJĀ LAPĀ.
- [10] SASTATNU VIDUSDALĀ UN AUGŠĒJĀ DALĀ PAREDZĒTAS CILPAS, KAS STIPRINĀTAS MŪRA ŠUVĒS. LEJASDALĀ UPES PUSĒ SASTATNES STIPRINĀT PIE ESOŠĀ BETONA. AILU VIETĀS UPES PUSES UN IEKŠPAGALMA PUSES SASTATNES SAVSTARPĒJI SASTIPRINĀT. AUGŠDALĀ SASTATNES SIENU ABĀS PUSĒS SAVILKT (SASTIPRINĀT KOPĀ). STARP MŪRI UN SASTATNĒM LIKT MĪKSTU MATERIĀLU (PUTUPOLISTIROLU).
- [11] LAI PILNĪBĀ TIKTU IZSLĒGTA IZMANTOTO VIELU (CEMENTS, KALKIS U.C.) NOKLŪŠANA DAUGAVAS UN PĒRSES UPĒS, MATERIĀLUS GLABĀT TIKAI IEKŠĒJĀ PAGALMĀ. MATERIĀLUS UZGLABĀT UZ PALETĒM, KAS NOVĪETOTAS PLĒVES VANNĀS AR ŪDENS SAVĀKŠANU, SAUSUS, ATBILSTOŠI NOSEGTUS.
- [12] MATERIĀLU PADOŠANA UPES PUSES SIENĀM TIEK RISINĀTA, NO IEKŠPAGALMA PUSES TOS PACELOT AR TRĪŠU MEHĀNISMU LĪDZ ATTIECĪGĀJAM SASTATNU LĪMENIM, UN, CAUR MŪRĒ ESOŠAJIEM AILU ATVĒRUMIEM, PADODOT TOS UZ UPES PUSES SATATNĒM.
- [13] SKAT. KOPĀ AR LAPAS DOP 0-01 PIEZĪMĒM.

PERSPEKTĪVĀ BŪVTĀFELES IZVIETOŠANAS VIETA



ESOŠS GRANTĒTS PIEBRAUCAMAIS CELŠ; LIETOJOT CELU, NEBOJĀT ARHITEKTŪRAS PIEMINEKLI

KIOSKS; IESPĒJA PIESLĒGTIES ELEKTROTĪKLAM, UZSTĀDOT UZSKAITES MEZGLU

PROJ. MARGA VIRS PRIEKŠPILS BASTIONA SIENAS (SKAT. LAPĀ DOP 1-10 "3.KĀRTAS DARBI")

APZĪMĒJUMS	SPECIFIKĀCIJA – 1.KĀRTAS DARBI	SKAITS
	BŪVTĀFELES IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA, DARBA DROŠĪBAS UN PIRMĀS PALĪDZĪBAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	EVAKUĀCIJAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR PAGaidu INVENTĀRO ŽOGU ("BEKAERT" VAI EKIVALENTU) UN CELTNIETĪBAS PLĒVI	45 m
	NECAURSPĪDĪGA CELTNIETĪBAS PLĒVE INVENTĀRĀ ŽOGA AIZKLĀŠANAI	99 m2
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR NOROBEŽOJOŠO LENTU (UZ DARBU LAIKU)	22 m
	BŪVMATERIĀLU NOKRAUŠANAS LAUKUMU IZVEIDOŠANA	1 kompl.
	SASTATNU UZSTĀDĪŠANA UN DEMONTĀŽA; INVENTĀRĀS SASTATNES; SASTATNU AIZSARGTĪKLA UZSTĀDĪŠANA	195 m2
	ZEMES NOSEĢŠANA ZEM SASTATNĒM (PAREDZĒTO DARBU ZONĀ) AR ARMĒTU CELTNIETĪBAS PLĒVI PLATUMS 2.0M UN LĪMĒTU KOKŠKIEDRU PLĀTNI 8mm; TERITORIJAS SAKĀRTOŠANA PĒC DARBU PABEIGŠANAS	~30 m2
	SASTATNU ZEMĒJUMA IERĪKOŠANA	2 kompl.
	BIOTUALETES ĪRE UN UZSTĀDĪŠANA (1 GAB.)	1 mēn.
	BŪVGRUŽU KONTEINERA (8,5M3) ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	OFISA (SADZĪVES) KONTEINERA ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA	
	VIETA JAVAS SAGATAVOŠANAI (MATERIĀLU APSTRĀDES VIETA)	1 kompl.
	PAGaidu ELEKTROPESLĒGUMS UN SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA, T.SK., PIEVILKŠANA NO ESOŠĀ KIOSKA	1 kompl. ~55 m

	VĒSTURISKO IEEJU VIETAS	
	PIENEMTAIS SIENAS APZĪMĒJUMA BURTS	
	TRANSPORTA KUSTĪBA UZ BŪVLAUKUMU	

PASŪTĪTĀJS:

(VĀRDS, UZVĀRDS)

(IESTĀDE, AMATS)

(DATUMS) _____ (PARAKSTS)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKLAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DALAS ATBILSTOŠI BŪVATLĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS **ARTŪRS LAPINŠ** (VĀRDS UN UZVĀRDS)

10-0758 (SERTIFIKĀTA NR.)

DATUMS _____ PARAKSTS _____

PROJEKTA DALĪJUMS KĀRTĀS	
2 (PĒC PASŪTĪTĀJA LŪGUMA)	02.06.2017.
PĒC EKSPERTA NORĀDĒM – JAUNAS PIEZĪMES: NR. 10, 11; MAINĪTA MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA; PRECIZĒTS RASĒJUMA NOSAUKUMS	20.09.2016.
Nr	IZMAIŅAS APRAKSTS DATUMS

02.06.2017
DATUMS

OBJEKTS KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS
PASŪTĪTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

BŪVPR.D.VAD. ARTŪRS LAPINŠ
ARHITEKTS A.LAPINŠ
IZSTRĀDĀJA K.KLIMBE

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS.
1.KĀRTAS DARBI

STADIJA BP
MARKA DOP
MĒROGS 1:500
PAS.NR. 2017-032 LAPA(S) 1-01-1 IZM. 2



BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

MĒROGS 1:500



(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

____.gada ____ . _____

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%), EUR **0,00**
Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h **0**

Nr.p.k.	Tāmes Nr.	Objekta izmaksu nosaukums	Kopējās objekta izmaksas /EUR/
1	1	Kopējie būvdarbi (1.kārtas darbi)	0,00
		Kopā :	0,00
		PVN 21% :	0,00
		Kopā ar PVN:	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja: Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00
Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta 2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k.	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehān., instr.īre, amortizācija (EUR)	
		1.kārtas darbi					
1	1	Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	Mūra sienu galu A (sienai G) un D (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOPĀ:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virszdevumi (%)							
Peļņa (%)							
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			0,00				
Kopā bez PVN 21%			0,00				

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:

Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP DOP daļa

										Tāmes izmaksas EUR				
										0,00				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	DOP 1-01													
1	Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu	t/m	45,00											
	"Beakert" inventāra žogs vai ekvivalents	t/m	45,00											
2	Nožogojuma aizklāšana ar plēvi	m2	99,00											
	PVC plēve	m2	108,90											
3	Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku)	t/m	22,00											
4	Būvtafēles izgatavošana, uzstādīšana	kompl	1,00											
5	Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana	kompl	1,00											
6	Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana	kompl	1,00											
7	Ofisa konteineru uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
8	Būvgružu konteineru īre 8.5 m3 (1 mēn.)	gab	1,00											
9	Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja uzstādīšana (~55m)	kompl	1,00											
10	Biotualetes uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
11	Vieta javas sagatavošanai	kompl	1,00											
12	Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana	kompl	1,00											
13	Zemes noseģšana zem sastatnēm un parējā darba zonā	m2	30,00											
	PVC plēve	m2	33,00											
14	Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas	teritorija	1,00											
15	Būvlaukuma uzturēšana 1 mēn.	būvlaukums	1,00											
	KOPA	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur									0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertif.Nr 20-3506

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 8
Mūra sienu galu A (sienai G) un D (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	Sienas gali "A"; "D" AR3-01; AR3-07													
	AD2													
1	Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana	m2	95,00											
2	Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno raksturu	m2	95,00											
	Kaļķu java	m3	10,45											
3	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	95,00											
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķīdums ūdenī vai ekvivalents	l	23,75											
	SAS (sastatnes)													
4	Sastatņu montāža, demontāža	m2	195,00											
	inventāra sastatņu īre	m2	195,00											
5	Sastatņu zemējuma ierīkošana	kompl	2,00											
6	Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	195,00											
	aizsargtīkls	m2	214,50											
	Kopā:	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu,būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertif.Nr 20-3506

2.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienu galu "B" (sienai G) un "C" (sienai A)
fasādes konstrukciju konservācijas darbi

max pielaujamā slodze
uz mūra augšdaļas 1,5kN uz m2

SASTATNES AUGŠDALĀ UN
AILU VIETĀS SIENU ABĀS
PUSĒS SAVSTARPĒJI
SAVILKT (SKAT. 10.PIEZĪMI)

INVENTĀRĀS SASTATNES
(LEJASDALĀ STIPRINĀT
UZ KONSOLĒM);
KONSOLĒS APAKŠĒJO
DALU IELĪMĒT ESOŠAJĀ
BETONĀ AR
2-KOMPONENTU
BŪVKĪMIJU "HILTI
HIT-HY 70" VAI
EKVIVALENTU,
NODROŠINOT 16kN
NESTSPĒJU
(atbilstoši
stiprinājuma solim
3,07m);
STIPRINĀJUMIEM
MŪRĒ NODROŠINĀT
NESTSPĒJU 7 kN
(skat. DOP0-01
5.piezīmi)

INVENTĀRĀS
SASTATNES: MAX
SLODZE UZ KATRU
SASTATNU PĒDU
PĀRI IR 18kN
(atbilstoši pēdu
solim 3,07m)


upes puse

ŪDENS LĪMENIS

max pielaujamā slodze
uz pamatnes 150kN uz m2

MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA

UGUNSDROŠĪBAS LĪDZEKĻU STENDS UN PIRMĀS
PALĪDZĪBAS APTIECIŅA



PROJ. SKATU PLATFORMA KOKA KONSTRUKCIJĀS
(SKAT. LAPĀ DOP 1-10 "3.KĀRTAS DARBI")

PILSDRUPU MŪRU
KONSERVĀCIJA

PAGALMA BRUGA PĀRBŪVE
(REKONSTRUKCIJA) UN
RESTAURĀCIJA

PROJEKTA
KĀRTAS NR.

PIEZĪMES:

- [1] RASĒJUMAM PAR PAMATU IZMANTOTS 2016.G. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
- [2] PROJEKTA IETVAROS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS UN SAGATAVOŠANAS DARBIEM NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS SKAT. ŠAJĀ LAPĀ.
- [3] NORĀDĪJUMUS PAR BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANU UN BŪVDARBU VEIKŠANU SKATĪT DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ.
- [4] IZMANTOJAMAS SASTATNES, KURAS ATBILST LR MK NOTEIKUMIEM NR. 526 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU UN STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ". NEPIECIEŠAMA 2. SASTATNU KLASĒ AR EJAS PLATUMU 700 MM (KLĀJA MAX NOSLODZE 1,5kN/M2).
- [5] PIRMS SASTATNU MONTĀŽAS NOSEGT ESOŠO SEGUMU AP PILSDRUPĀM.
- [6] NOROBEŽOJOŠO ŽOGU AIZKLĀT AR NECAURSPĪDĪGU MATERIĀLU.
- [7] BŪVLAUKUMĀ ŪDENSAPGĀDE PAREDZĒTA NO DAUGAVAS.
- [8] UZ OBJEKTAM PIEGULOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSLĒGARMATŪRĀM UN KONTROLAKĀM AIZLIEGTS IZVIETOT GRŪTI PĀRVIETOJAMUS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA ELEMENTUS (BŪVGRUŽU KONTEINEINERUS U.C.).
- [9] BŪVPROJEKTĀ BŪVDARBUS IESPĒJAMS SADALĪT ETAPOS, IEVĒROJOT GALVENOS DARBA ORGANIZĀCIJAS PRINCIPUS, KAS NORĀDĪTI SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ UN ŠAJĀ LAPĀ.
- [10] SASTATNU VIDUSDALĀ UN AUGŠĒJĀ DALĀ PAREDZĒTAS CILPAS, KAS STIPRINĀTAS MŪRA ŠUVĒS. LEJASDALĀ UPES PUSĒ SASTATNES STIPRINĀT PIE ESOŠĀ BETONA. AILU VIETĀS UPES PUSES UN IEKŠPAGALMA PUSES SASTATNES SAVSTARPĒJI SASTIPRINĀT. AUGŠDALĀ SASTATNES SIENU ABĀS PUSĒS SAVILKT (SASTIPRINĀT KOPĀ). STARP MŪRI UN SASTATNĒM LIKT MĪKSTU MATERIĀLU (PUTUPOLISTIROLU).
- [11] LAI PILNĪBĀ TIKTU IZSLĒGTA IZMANTOTO VIELU (CEMENTS, KALKIS U.C.) NOKLŪŠANA DAUGAVAS UN PĒRSES UPĒS, MATERIĀLUS GLABĀT TIKAI IEKŠĒJĀ PAGALMĀ. MATERIĀLUS UZGLABĀT UZ PALETĒM, KAS NOVĪETOTAS PLĒVES VANNĀS AR ŪDENS SAVĀKŠANU, SAUSUS, ATBILSTOŠI NOSEGTUS.
- [12] MATERIĀLU PADOŠANA UPES PUSES SIENĀM TIEK RISINĀTA, NO IEKŠPAGALMA PUSES TOS PACELOT AR TRĪŠU MEHĀNISMU LĪDZ ATTIECĪGAJAM SASTATNU LĪMENIM, UN, CAUR MŪRĒ ESOŠAJIEM AILU ATVĒRUMIEM, PADODOT TOS UZ UPES PUSES SATATNĒM.
- [13] SKAT. KOPĀ AR LAPAS DOP 0-01 PIEZĪMĒM.

PERSPEKTĪVĀ BŪVTĀFELES
IZVIETOŠANAS VIETA



ESOŠS GRANTĒTS PIEBRAUCAMAIS
CELŠ; LIETOJOT CELU, NEBOJĀT
ARHITEKTŪRAS PIEMINEKLI

KIOSKS; IESPĒJA PIESLĒGTIES
ELEKTROTĪKLAM, UZSTĀDOT
UZSKAITES MEZGLU

APZĪMĒJUMS	SPECIFIKĀCIJA – 2.KĀRTAS DARBI	SKAITS
	BŪVTĀFELES IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA, DARBA DROŠĪBAS UN PIRMĀS PALĪDZĪBAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	EVAKUĀCIJAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR PAGaidu INVENTĀRO ŽOGU ("BEKAERT" VAI EKVIVALENTU) UN CELTNIETĪBAS PLĒVI	45 m
	NECAURSPĪDĪGA CELTNIETĪBAS PLĒVE INVENTĀRĀ ŽOGA AIZKLĀŠANAI	99 m2
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR NOROBEŽOJOŠO LENTU (UZ DARBU LAIKU)	25 m
	BŪVMATERIĀLU NOKRAUŠANAS LAUKUMU IZVEIDOŠANA	1 kompl.
	SASTATNU UZSTĀDĪŠANA UN DEMONTĀŽA; INVENTĀRĀS SASTATNES; SASTATNU AIZSARGTĪKLA UZSTĀDĪŠANA	240 m2
	ZEMES NOSEĢŠANA ZEM SASTATNĒM (PAREDZĒTO DARBU ZONĀ) AR ARMĒTU CELTNIETĪBAS PLĒVI PLATUMS 2.0M UN LĪMĒTU KOKŠKIEDRU PLĀTNI 8mm; TERITORIJAS SAKĀRTOŠANA PĒC DARBU PABEIGŠANAS	~34 m2
	SASTATNU ZEMĒJUMA IERĪKOŠANA	2 kompl.
	BIOTUALETES ĪRE UN UZSTĀDĪŠANA (1 GAB.)	1 mēn.
	BŪVGRUŽU KONTEINERA (8,5M3) ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	OFISA (SADZĪVES) KONTEINERA ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA	
	VIETA JAVAS SAGATAVOŠANAI (MATERIĀLU APSTRĀDES VIETA)	1 kompl.
	PAGaidu ELEKTROPESLĒGUMS UN SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA, T.SK., PIEVILKŠANA NO ESOŠĀ KIOSKA	1 kompl. ~55 m

	VĒSTURISKO IEEJU VIETAS	
	PIENEMTAIS SIENAS APZĪMĒJUMA BURTS	
	TRANSPORTA KUSTĪBA UZ BŪVLAUKUMU	

PASŪTĪTĀJS:

(VĀRDS, UZVĀRDS)

(IESTĀDE, AMATS)

(DATUMS) (PARAKSTS)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKLAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS
VISAS NEPIECIEŠAMĀS DALAS ATBILSTOŠI
BŪVATLĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA
VADĪTĀJS **ARTŪRS LAPINŠ**
(VĀRDS UN UZVĀRDS)
10-0758
(SERTIFIKĀTA NR.)

DATUMS PARAKSTS

PROJEKTA DALĪJUMS KĀRTĀS		
2	(PĒC PASŪTĪTĀJA LŪGUMA)	02.06.2017.
PĒC EKSPERTA NORĀDĒM – JAUNAS PIEZĪMES: NR. 10, 11; MAINĪTA MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA; PRECIZĒTS RASĒJUMA		
1	NOSAUKUMS	20.09.2016.
Nr	IZMAIŅAS APRAKSTS	DATUMS

02.06.2017

DATUMS

OBJEKTS KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS

PASŪTĪTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

BŪVPR.D.VAD. ARTŪRS LAPINŠ

ARHITEKTS A.LAPINŠ

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS.

2.KĀRTAS DARBI

STADIJA BP

MARKA DOP

MĒROGS 1:500


PAS.NR. 2017-032

LAPA(S) 1-01-2 IZM. 2

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

MĒROGS 1:500

5 0 10 20m



GRUPA SA

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

____.gada ____ . _____

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%), EUR 0,00
Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Nr.p.k.	Tāmes Nr.	Objekta izmaksu nosaukums	Kopējās objekta izmaksas /EUR/
1	1	Kopējie būvdarbi (2.kārtas darbi)	0,00
		Kopā :	0,00
		PVN 21% :	0,00
		Kopā ar PVN:	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja: Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00
Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta 2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k.	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehān., instr.īre, amortizācija (EUR)	
		2.kārtas darbi					
1	1	Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	Mūra sienu galu A (sienai G) un D (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOPĀ:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virsziedvumi (%)							
Peļņa (%)							
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			0,00				
Kopā bez PVN 21%			0,00				

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:

Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP DOP daļa

										Tāmes izmaksas EUR				
										0,00				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	DOP 1-01													
1	Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu	t/m	45,00											
	"Beakert" inventāra žogs vai ekvivalents	t/m	45,00											
2	Nožogojuma aizklāšana ar plēvi	m2	99,00											
	PVC plēve	m2	108,90											
3	Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku)	t/m	25,00											
4	Būvtafēles izgatavošana, uzstādīšana	kompl	1,00											
5	Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana	kompl	1,00											
6	Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana	kompl	1,00											
7	Ofisa konteineru uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
8	Būvgružu konteineru īre 8.5 m3 (1 mēn.)	gab	1,00											
9	Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja uzstādīšana (~55m)	kompl	1,00											
10	Biotualetes uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
11	Vieta javas sagatavošanai	kompl	1,00											
12	Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana	kompl	1,00											
13	Zemes noseģšana zem sastatnēm un parējā darba zonā	m2	34,00											
	PVC plēve	m2	37,40											
14	Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas	teritorija	1,00											
15	Būvlaukuma uzturēšana 1 mēn.	būvlaukums	1,00											
	KOPA	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur									0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertif.Nr 20-3506

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 8
Mūra sienu galu A (sienai G) un D (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	Sienas gali "B"; "C" AR3-01; AR3-07													
	AD2													
1	Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana	m2	83,00											
2	Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno raksturu	m2	83,00											
	Kaļķu java	m3	9,13											
3	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	83,00											
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķīdums ūdenī vai ekvivalents	l	20,75											
	SAS (sastatnes)													
4	Sastatņu montāža, demontāža	m2	240,00											
	inventāra sastatņu īre	m2	240,00											
5	Sastatņu zemējuma ierīkošana	kompl	2,00											
6	Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	240,00											
	aizsargtīkls	m2	264,00											
	Kopā:	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu,būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Sastādīja: E.Pētersons
sertif.Nr 20-3506

3.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienas "G" ziemeļu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (Pērses puse);


Mūra sienas "A" dienvidu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (Daugavas puse);

Labiekārtošanas darbi

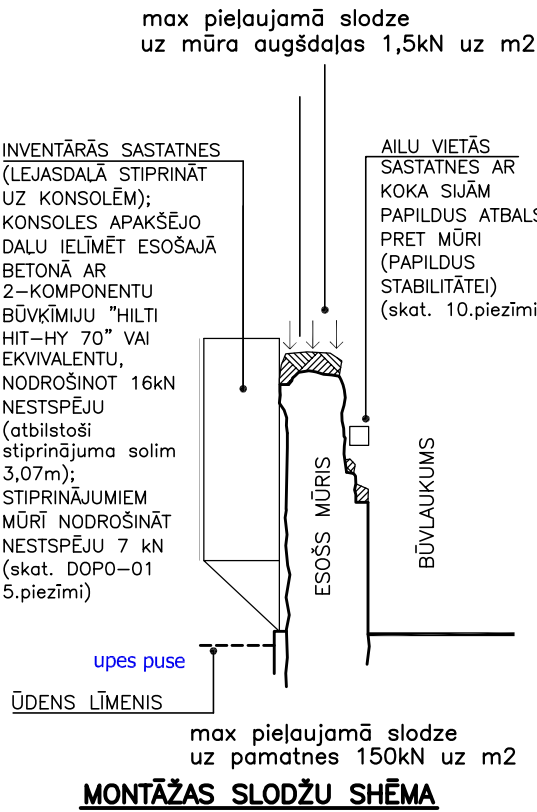


PROJ. SKATU PLATFORMA KOKA KONSTRUKCIJĀS

UGUNSDROŠĪBAS LĪDZEKĻU STENDS UN PIRMĀS PALĪDZĪBAS APTIECIŅA



- PILSDRUPU MŪRU KONSERVĀCIJA
- PAGALMA BRUGA PĀRBŪVE (REKONSTRUKCIJA) UN RESTAURĀCIJA
- PROJEKTA KĀRTAS NR.

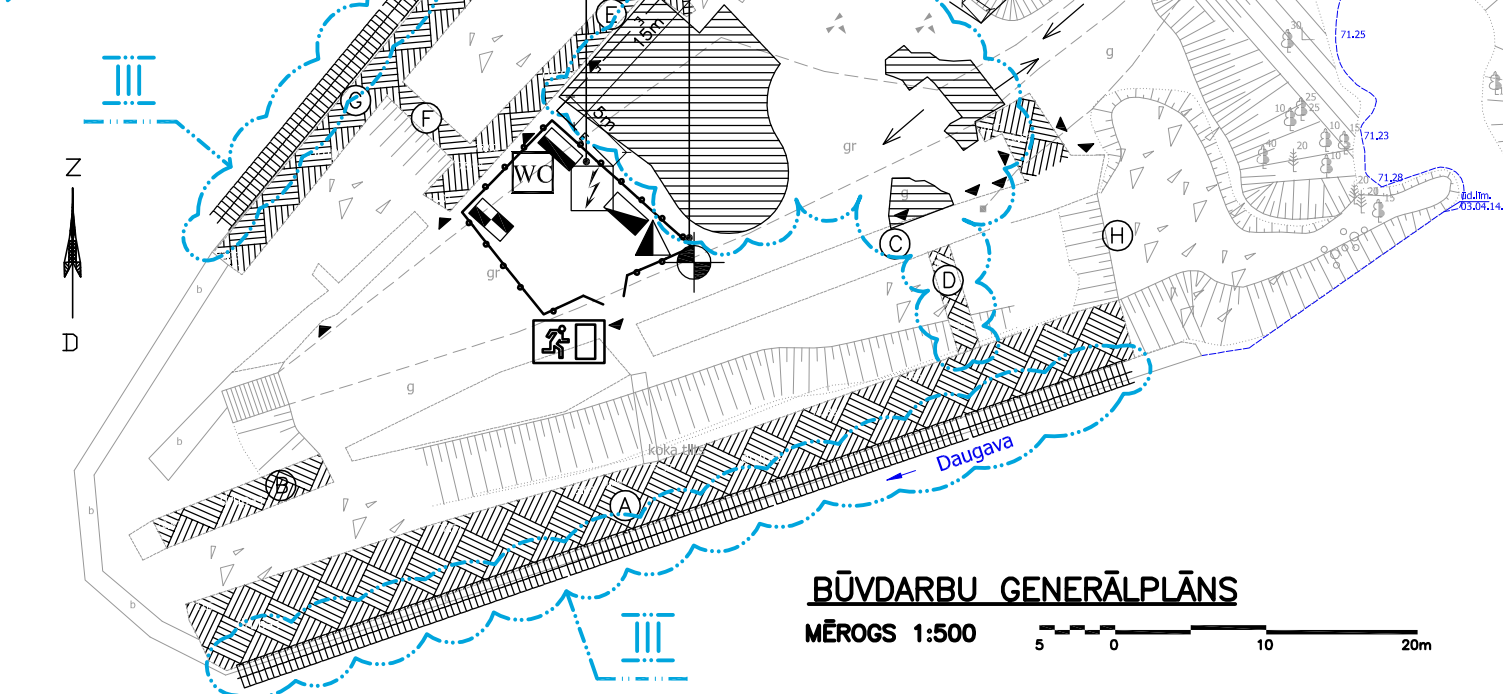

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

MĒROGS 1:500



- PIEZĪMES:**
- [1] RASĒJUMAM PAR PAMATU IZMANTOTS 2016.G. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
 - [2] PROJEKTA IETVAROS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS UN SAGATAVOŠANAS DARBIEM NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS SKAT. ŠAJĀ LAPĀ.
 - [3] NORĀDĪJUMUS PAR BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANU UN BŪVDARBU VEIKŠANU SKATĪT DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ.
 - [4] IZMANTOJAMAS SASATNES, KURAS ATBILST LR MK NOTEIKUMIEM NR. 526 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU UN STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ". NEPIECIEŠAMA 2. SASATNU KLASĒ AR EJAS PLATUMU 700 MM (KLĀJA MAX NOSLODZE 1,5kN/M2).
 - [5] PIRMS SASATNU MONTĀŽAS NOSEGT ESOŠO SEGUMU AP PILSDRUPĀM.
 - [6] NOROBEŽOJOŠO ŽOGU AIZKLĀT AR NECAURSPĪDĪGU MATERIĀLU.
 - [7] BŪVLAUKUMĀ ŪDENSAPGĀDE PAREDZĒTA NO DAUGAVAS.
 - [8] UZ OBJEKTAM PIEGULOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSLĒGARMATŪRĀM UN KONTROLAKĀM AIZLIEGTS IZVIETOT GRŪTI PĀRVIETOJAMUS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA ELEMENTUS (BŪVGRUŽU KONTEINEINERUS U.C.).
 - [9] BŪVPROJEKTĀ BŪVDARBUS IESPĒJAMS SADALĪT ETAPOS, IEVĒROJOT GALVENOS DARBA ORGANIZĀCIJAS PRINCIPUS, KAS NORĀDĪTI SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ UN ŠAJĀ LAPĀ.
 - [10] SASATNU VIDUSDAĻĀ UN AUGŠĒJĀ DAĻĀ PAREDZĒTAS CILPAS, KAS STIPRINĀTAS MŪRA ŠUVĒS. LEJASDALĒ UPES PUSĒ SASATNES STIPRINĀT PIE ESOŠĀ BETONA. AILU VIETĀS SASATNES AR KOKA SIJĀM PAPILDUS ATBALSTĪT PRET MŪRI (PAPILDUS STABILITĀTEI). STARP MŪRI UN SASATNĒM LIKT MĪKSTU MATERIĀLU (PUTUPOLISTIROLU).
 - [11] LAI PILNĪBĀ TIKTU IZSLĒGTA IZMANTOTO VIELU (CEMENTS, KALKIS U.C.) NOKLŪŠANA DAUGAVAS UN PĒRSES UPĒS, MATERIĀLUS GLABĀT TIKAI IEKŠĒJĀ PAGALMĀ. MATERIĀLUS UZGLABĀT UZ PALETĒM, KAS NOVĪETOTAS PLĒVES VANNĀS AR ŪDENS SAVĀKŠANU, SAUSUS, ATBILSTOŠI NOSEGTUS.
 - [12] MATERIĀLU PADOŠANA UPES PUSES SIENĀM TIEK RISINĀTA, NO IEKŠPAGALMA PUSES TOS PACELOT AR TRĪŠU MEHĀNISMU LĪDZ ATTIECĪGĀJAM SASATNU LĪMENIM, UN, CAUR MŪRĒ ESOŠAJIEM AILU ATVĒRUMIEM, PADODOT TOS UZ UPES PUSES SATATNĒM.
 - [13] SKAT. KOPĀ AR LAPAS DOP 0-01 PIEZĪMĒM.

PERSPEKTĪVĀ BŪVTĀFELES IZVIETOŠANAS VIETA



ESOŠS GRANTĒTS PIEBRAUCAMAIS CELŠ; LIETOJOT CELU, NEBOJĀT ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻI

KIOSKS; IESPĒJA PIESLĒGTIES ELEKTROTĪKLAM, UZSTĀDOT UZSKAITES MEZGLU

APZĪMĒJUMS	SPECIFIKĀCIJA – 3.KĀRTAS DARBI	SKAITS
	BŪVTĀFELES IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA, DARBA DROŠĪBAS UN PIRMĀS PALĪDZĪBAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	EVAKUĀCIJAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR PAGaidu INVENTĀRO ŽOGU ("BEKAERT" VAI EKVIVALENTU) UN CELTNIETĪBAS PLĒVI	40 m
	NECAURSPĪDĪGA CELTNIETĪBAS PLĒVE INVENTĀRĀ ŽOGA AIZKLĀŠANAI	88 m2
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR NOROBEŽOJOŠO LENTU (UZ DARBU LAIKU)	105 m
	BŪVMATERIĀLU NOKRAUŠANAS LAUKUMU IZVEIDOŠANA	2 kompl.
	SASATNU UZSTĀDĪŠANA UN DEMONTĀŽA; INVENTĀRĀS SASATNES; SASATNU AIZSARGTĪKLA UZSTĀDĪŠANA	1118 m2
	ZEMES NOSEGŠANA ZEM SASATNĒM (PAREDZĒTO DARBU ZONĀ) AR ARMĒTU CELTNIETĪBAS PLĒVI PLATUMS 2.0M UN LĪMĒTU KOKŠKIEDRU PLĀTNI 8mm; TERITORIJAS SAKĀRTOŠANA PĒC DARBU PABEIGŠANAS	0 m2
	SASATNU ZEMĒJUMA IERĪKOŠANA	2 kompl.
	BIOTUALETES ĪRE UN UZSTĀDĪŠANA (1 GAB.)	3 mēn.
	BŪVGRUŽU KONTEINERA (8,5M3) ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	OFISA (SADZĪVES) KONTEINERA ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA	
	VIETA JAVAS SAGATAVOŠANAI (MATERIĀLU APSTRĀDES VIETA)	1 kompl.
	PAGaidu ELEKTROPIESLĒGUMS UN SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA, T.SK., PIEVILKŠANA NO ESOŠĀ KIOSKA	1 kompl. ~85 m

	VĒSTURISKO IEEJU VIETAS	
	PIENEMTAIS SIENAS APZĪMĒJUMA BURTS	
	TRANSPORTA KUSTĪBA UZ BŪVLAUKUMU	

PASŪTĪTĀJS:

(VĀRDS, UZVĀRDS)

(IESTĀDE, AMATS)

(DATUMS)

(PARAKSTS)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKLAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATLĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS **ARTŪRS LAPINŠ** (VĀRDS UN UZVĀRDS)

10-0758 (SERTIFIKĀTA NR.)

DATUMS

PARAKSTS

2	PROJEKTA DAĻĪJUMS KĀRTĀS (PĒC PASŪTĪTĀJA LŪGUMA)	02.06.2017.
1	PĒC EKSPERTA NORĀDĒM – JAUNAS PIEZĪMES: NR. 10, 11; MAINĪTA MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA; PRECIZĒTS RASĒJUMA NOSAUKUMS	20.09.2016.
Nr	IZMAIŅAS APRAKSTS	DATUMS

02.06.2017 DATUMS

OBJEKTS KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS

PASŪTĪTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

BŪVPR.D.VAD. ARTŪRS LAPINŠ

ARHITEKTS A.LAPINŠ

IZSTRĀDĀJA K.KLIMBE

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS. 3.KĀRTAS DARBI

STADIJA BP

MARKA DOP

MĒROGS 1:500

PAS.NR. 2017-032 LAPA(S) 1-01-3 IZM. 2

ARHITEKTŌNISKĀS IZPĒTES ARHĪVA NR.

GRUPA

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

____.gada ____ . _____

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%), EUR 0,00
Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Nr.p.k.	Tāmes Nr.	Objekta izmaksu nosaukums	Kopējās objekta izmaksas /EUR/
1	1	Kopējie būvdarbi (3.kārtas darbi)	0,00
		Kopā :	0,00
		PVN 21% :	0,00
		Kopā ar PVN:	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja: Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00
Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta 2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k.	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehān., instr.īre, amortizācija (EUR)	
		3.kārtas darbi					
1	1	Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	Mūra sienas "G" ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4	Mūra sienas "A" dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9	Labiekārtošanas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOPĀ:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virszdevumi (%)							
Peļņa (%)							
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			0,00				
Kopā bez PVN 21%			0,00				

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:

Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP DOP daļa

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	DOP 1-01													
1	Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu	t/m	40,00											
	"Beakert" inventāra žogs vai ekvalents	t/m	40,00											
2	Nožogojuma aizklāšana ar plēvi	m2	88,00											
	PVC plēve	m2	96,80											
3	Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku)	t/m	105,00											
4	Būvtafeles izgatavošana, uzstādīšana	kompl	1,00											
5	Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana	kompl	1,00											
6	Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana	kompl	1,00											
7	Ofisa konteineru uzstādīšana, īre	mēn.	3,00											
8	Būvgružu konteineru īre 8.5 m3 (3 mēn.)	gab	1,00											
9	Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja uzstādīšana (~85m)	kompl	1,00											
10	Biotualetes uzstādīšana, īre	mēn.	3,00											
11	Vieta javas sagatavošanai	kompl	1,00											
12	Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana	kompl	2,00											
13	Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas	teritorija	1,00											
14	Būvlaukuma uzturēšana 3 mēn.	būvlaukums	1,00											
	KOPA	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur									0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Mūra sienas "G" ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

0.00

[illegible]

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
14	Kieģeļu mūra remonts, papildināšana, pāršuvošana ar ierastu šuvi	m2	4,57											
	lielzmēra sarkanie māla pilnkieģeļi, piem., Lode "Sencis" vai ekvivalenti	m3	0,46											
	Kaļķu java	m3	0,50											
15	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	4,57											
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķīdums ūdenī vai ekvivalents	l	1,14											
	EZ1													
16	Balsta stieņa (nerūsējošais tērauds d16mm) ar slīpiem slīpetiem galiem iestrādāšana mūra šuvē; to iedzenot urbumā 1/3 no konsoles garuma	vietas	64											
	Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm)	kompl	64											
	EW2													
17	Sastatņu koka vietu attīrīšana, dziļuma uzmērīšana, aiztapošana ar tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni	vieta	25											
	Antiseptizēts priedes koka aizbāznis	gab	25											
	JJ1													
18	Mūra augšdaļas izlīdzināšana ar kritumu	m2	20,00											
	Kaļķu java	m3	1,10											
19	Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	20,00											
	ģeotekstils "Tippex" vai ekvivalents	m2	22,00											
	māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm	m3	2,00											
	velēna	m2	20,00											
	LA1													
20	Laboratoriskās izpētes veikšana	paraugs	2											
	SAS													
21	Sastatņu montāža, demontāža	m2	438,51											
	inventāra sastatņu tīrē	m2	438,51											
22	Sastatņu zemējuma ierīkošana	kompl	1,00											
23	Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	438,51											
	aizsargtīkls	m2	482,36											
24	Sastatņu papildus atbalsta vietu izveide no koka sijām mūra sienās esošajās ailās, t.sk. Materiāli	kompl	8,00											
	Zāliena iesegšana uz sienām AR3-00													
25	Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseguma ieklāšanas, pārmūrējot kustīgās daļas (~0,3 m augstumā kodolam un akmeņu čaulai)	m2	174,00											
	laukakmeņi	m3	4,18											
	baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	1,91											
26	Mūra augšdaļas izlīdzināšana ar kritumu	m2	174,00											
	Kaļķu java	m3	9,57											
27	Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	174,00											
	ģeotekstils "Tippex" vai ekvivalents	m2	191,40											
	māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm	m3	17,40											
	velēna	m2	174,00											
	Kopā:	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 4

Mūra sienas "A" dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

[illegible]

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	Kaļķu java	m3	0,59											
15	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	5,33											
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķīdums ūdenī vai ekvivalents	l	1,33											
	EZ1													
16	Balsta stieņa (nerūsējošais tērauds d16mm) ar slīpiem slīpetiem galiem iestrādāšana mūra šuvē; to iedzenot urbumā 1/3 no konsoles garuma	vietas	83											
	Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm)	kompl	83											
	EW2													
17	Sastatņu koka vietu attīrīšana, dziļuma uzmērīšana, aiztapošana ar tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni	vieta	45											
	Antiseptizētās priedes koka aizbāznis	gab	45											
	JJ1													
18	Mūra augšdaļas izlīdzināšana ar kritumu	m2	15,50											
	Kaļķu java	m3	0,85											
19	Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	15,50											
	ģeotekstils "Tiptex" vai ekvivalents	m2	17,05											
	māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm	m3	1,55											
	velēna	m2	15,50											
	LA1													
20	Laboratoriskās izpētes veikšana	paraugs	2											
	SAS													
21	Sastatņu montāža, demontāža	m2	678,92											
	inventāra sastatņu īre	m2	678,92											
22	Sastatņu zemējuma ierīkošana	kompl	1,00											
23	Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	678,92											
	aizsargtīkls	m2	746,81											
24	Sastatņu papildus atbalsta vietu izveide no koka sijām mūra sienās esošajās ailās, t.sk. Materiāli	kompl	7,00											
	Zāļena iesegšana uz sienām AR3-00 «A» un «D» (sienas													
25	Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseguma ieklāšanas, pārmūrējot kustīgās daļas (~0,3 m augstumā kodolam un akmeņu čaulai)	m2	308,00											
	laukakmeņi	m3	7,39											
	baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	3,39											
26	Mūra augšdaļas izlīdzināšana ar kritumu	m2	308,00											
	Kaļķu java	m3	16,94											
27	Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	308,00											
	ģeotekstils "Tiptex" vai ekvivalents	m2	338,80											
	māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm	m3	30,80											
	velēna	m2	308,00											
	Kopā:	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu,būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 9
Labiekārtošanas darbi

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Tāmes izmaksas, EUR:	0,00
----------------------	------

[illegible]

[illegible]




Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
35	Mūra pāršuvošana ar vāji hidroaizsargātu grants javu, toni pieskaņojot katrā labojuma vietā veidojot dziļi ierautu šuvi	m2	20											
	Vāji hidroaizsargātu grants java	m3	1											
36	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	20											
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķīdums ūdenī vai ekvivalents	l	5											
37	Mūra čaulas paaugstināšana	m2	12,00											
	laukakmeņi	m3	0,29											
	balta grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	0,13											
38	Mūra augšdaļas izlīdzināšana ar kritumu	m2	50,00											
	Kaļķu java	m3	2,75											
39	Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	87,50											
	ģeotekstils "Tippex" vai ekvivalents	m2	96,25											
	māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm	m3	8,75											
	velēna	m2	87,50											
40	Margu metāla zemes skrūvju montāža gruntī	gab	54											
	Margu metāla zemes skrūves KRINNER KSF F 76x800-R, ar stata pamatni "Post Bearer Sword-R" vai ekviv.	kompl	27											
	Margu metāla zemes skrūves KRINNER KSF F 76x1000-R, ar stata pamatni "Post Bearer Plane-R" vai ekviv.	kompl	27											
41	Margu koka konstrukciju izgatavošana, montāža	m3	3,00											
	Antiseptizēti priedes kokmateriāli ēvelēti	m3	3,30											
	Montāžas palīgmateriāli	kompl	1,00											
42	Redzamo metāla elementu krāsošana	kompl	1,00											
	Krāsa tumši pelēka (RAL 7022)	kompl	1,00											
	Kopā:	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

4.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienas "G" dienvidu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (pagalma puse)

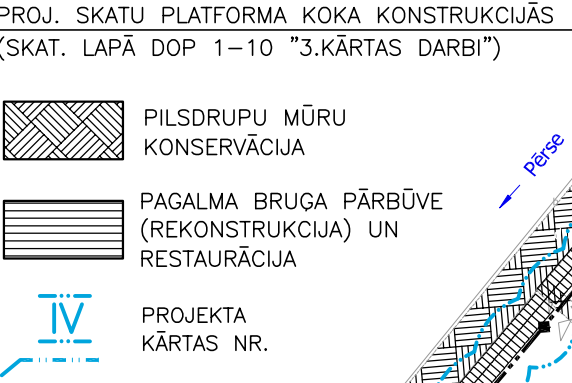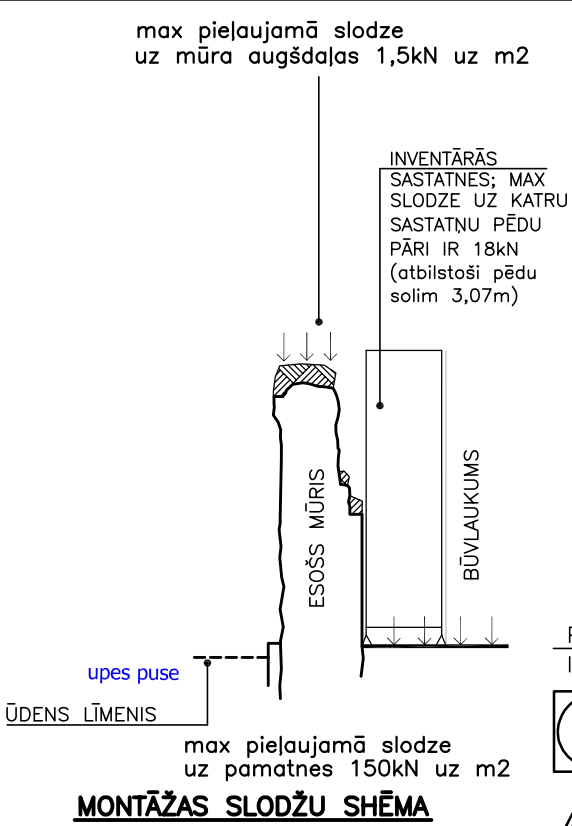


- PIEZĪMES:**
- [1] RASĒJUMAM PAR PAMATU IZMANTOTS 2016.G. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
 - [2] PROJEKTA IETVAROS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS UN SAGATAVOŠANAS DARBIEM NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS SKAT. ŠAJĀ LAPĀ.
 - [3] NORĀDĪJUMUS PAR BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANU UN BŪVDARBU VEIKŠANU SKATĪT DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ.
 - [4] IZMANTOJAMAS SASTATNES, KURAS ATBILST LR MK NOTEIKUMIEM NR. 526 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU UN STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ". NEPIECIEŠAMA 2. SASTATNU KLASĒ AR EJAS PLATUMU 700 MM (KLĀJA MAX NOSLODZE 1,5kN/M2).
 - [5] PIRMS SASTATNU MONTĀŽAS NOSEGT ESOŠO SEGUMU AP PILSDRUPĀM.
 - [6] NOROBEŽOJOŠO ŽOGU AIZKLĀT AR NECAURSPĪDĪGU MATERIĀLU.
 - [7] BŪVLAUKUMĀ ŪDENSAPGĀDE PAREDZĒTA NO DAUGAVAS.
 - [8] UZ OBJEKTAM PIEGULOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSLĒGARMATŪRĀM UN KONTROLAKĀM AIZLIEGTS IZVIETOT GRŪTI PĀRVIETOJAMUS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA ELEMENTUS (BŪVGROZU KONTEINEINERUS U.C.).
 - [9] BŪVPROJEKTĀ BŪVDARBUS IESPĒJAMS SADALĪT ETAPOS, IEVĒROJOT GALVENOS DARBA ORGANIZĀCIJAS PRINCIPUS, KAS NORĀDĪTI SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ UN ŠAJĀ LAPĀ.
 - [10] SASTATNU VIDUSDALĀ UN AUGŠĒJĀ DAĻĀ PAREDZĒTAS CILPAS, KAS STIPRINĀTAS MŪRA ŠUVĒS. STARP MŪRI UN SASTATNĒM LIKT MĪKSTU MATERIĀLU (PUTUPOLISTIROLU).
 - [11] LAI PILNĪBĀ TIKTU IZSLĒGTA IZMANTOTO VIELU (CEMENTS, KALKIS U.C.) NOKLŪŠANA DAUGAVAS UN PĒSES UPĒS, MATERIĀLUS GLABĀT TIKAI IEKŠĒJĀ PAGALMĀ. MATERIĀLUS UZGLABĀT UZ PALETĒM, KAS NOVĒTAS PLĒVES VANNĀS AR ŪDENS SAVĀKŠANU, SAUSUS, ATBILSTOŠI NOSEGTUS.
 - [12] MATERIĀLU PADOŠANA UPES PUSES SIENĀM TIEK RISINĀTA, NO IEKŠPAGALMA PUSES TOS PACELOT AR TRĪŠU MEHĀNISMU LĪDZ ATTIECĪGĀJAM SASTATNU LĪMENIM, UN, CAUR MŪRĪ ESOŠAJIEM AILU ATVĒRUMIEM, PADODOT TOS UZ UPES PUSES SATATNĒM.
 - [13] SKAT. KOPĀ AR LAPAS DOP 0–01 PIEZĪMĒM.



ESOŠS GRANTĒTS PIEBRAUCAMAIS CELŠ; LIETOJOT CELU, NEBOJĀT ARHITEKTŪRAS PIEMINEKLI

KIOSKS; IESPĒJA PIESLĒGTIES ELEKTROTĪKLAM, UZSTĀDOT UZSKAITES MEZGLU

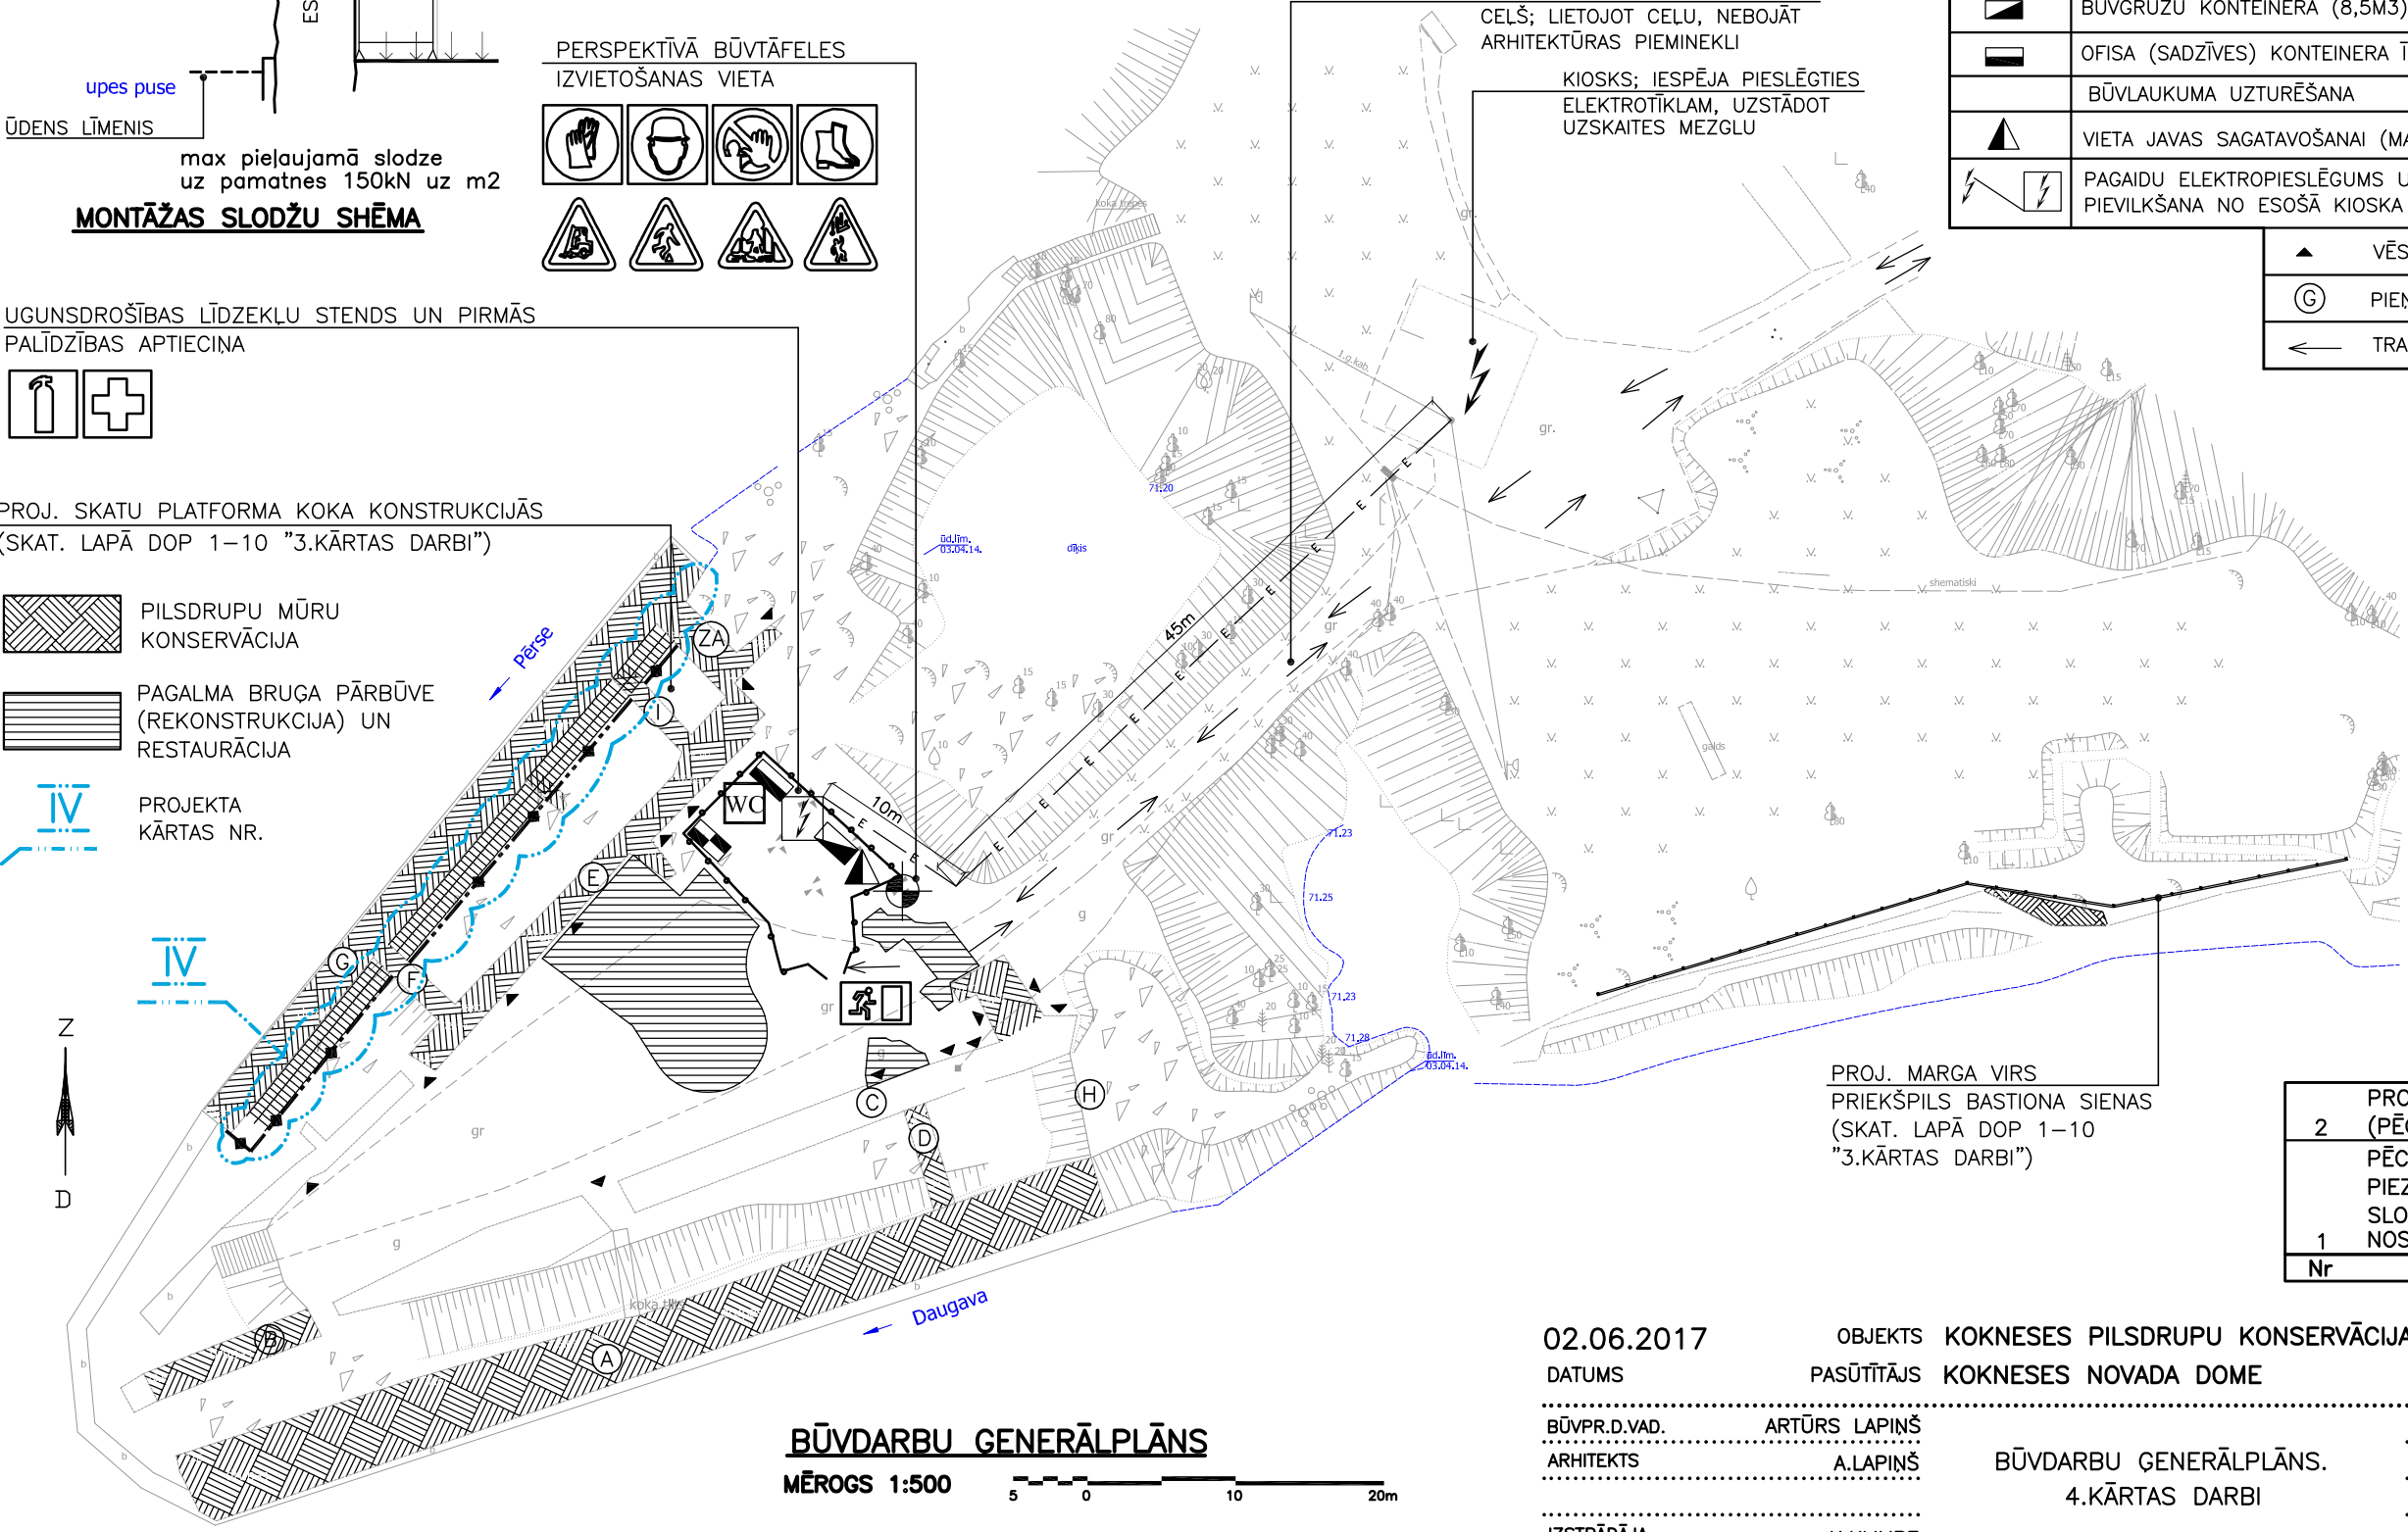

PROJ. MARGA VIRS PRIEKŠPILS BASTIONA SIENAS (SKAT. LAPĀ DOP 1–10 "3.KĀRTAS DARBI")

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

MĒROGS 1:500


02.06.2017
DATUMS

BŪVPR.D.VAD. ARTŪRS LAPINŠ
ARHITEKTS A.LAPINŠ
IZSTRĀDĀJA K.KLIMBE

OBJEKTS KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS
PASŪTĪTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS.
4.KĀRTAS DARBI

STADIJA BP
MARKA DOP
MĒROGS 1:500
PAS.NR. 2017-032 LAPA(S) 1–01–4 IZM. 2



APZĪMĒJUMS	SPECIFIKĀCIJA – 4.KĀRTAS DARBI	SKAITS
	BŪVTĀFELES IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA, DARBA DROŠĪBAS UN PIRMĀS PALĪDZĪBAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	EVAKUĀCIJAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR PAGaidu INVENTĀRO ŽOGU ("BEKAERT" VAI EKVIVALENTU) UN CELTĒNICĪBAS PLĒVI	45 m
	NECAURSPĪDĪGA CELTĒNICĪBAS PLĒVE INVENTĀRĀ ŽOGA AIZKLĀŠANAI	99 m2
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR NOROBEŽOJOŠO LENTU (UZ DARBU LAIKU)	50 m
	BŪVMATERIĀLU NOKRAUŠANAS LAUKUMU IZVEIDOŠANA	1 kompl.
	SASTATNU UZSTĀDĪŠANA UN DEMONTĀŽA; INVENTĀRĀS SASTATNES; SASTATNU AIZSARGTĪKLA UZSTĀDĪŠANA	430 m2
	ZEMES NOSEĢŠANA ZEM SASTATNĒM (PAREDZĒTO DARBU ZONĀ) AR ARMĒTU CELTĒNICĪBAS PLĒVI PLATUMS 2.0M UN LĪMĒTU KOKŠKIEDRU PLĀTNI 8mm; TERITORIJAS SAKĀRTOŠANA PĒC DARBU PABEIGŠANAS	~90 m2
	SASTATNU ZEMĒJUMA IERĪKOŠANA	1 kompl.
	BIOTUALETES ĪRE UN UZSTĀDĪŠANA (1 GAB.)	2 mēn.
	BŪVGROZU KONTEINERA (8,5M3) ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	OFISA (SADZĪVES) KONTEINERA ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA	
	VIETA JAVAS SAGATAVOŠANAI (MATERIĀLU APSTRĀDES VIETA)	1 kompl.
	PAGaidu ELEKTROPESLĒGUMS UN SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA, T.SK., PIEVLKŠANA NO ESOŠĀ KIOSKA	1 kompl. ~55 m

	VĒSTURISKO IEEJU VIETAS	
	PIENEMTAIS SIENAS APZĪMĒJUMA BURTS	
	TRANSPORTA KUSTĪBA UZ BŪVLAUKUMU	

PASŪTĪTĀJS:

(VĀRDS, UZVĀRDS)

(IESTĀDE, AMATS)

(DATUMS) (PARAKSTS)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKLAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATLĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS **ARTŪRS LAPINŠ**
(VĀRDS UN UZVĀRDS)
10-0758
(SERTIFIKĀTA NR.)

DATUMS PARAKSTS

PROJEKTA DAĻĪJUMS KĀRTĀS	
2 (PĒC PASŪTĪTĀJA LŪGUMA)	02.06.2017.
PĒC EKSPERTA NORĀDĒM – JAUNAS PIEZĪMES: NR. 10, 11; MAINĪTA MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA; PRECIZĒTS RASĒJUMA NOSAUKUMS	20.09.2016.
Nr IZMAIŅAS APRAKSTS	DATUMS

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

____.gada ____ . _____

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%), EUR 0,00
Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Nr.p.k.	Tāmes Nr.	Objekta izmaksu nosaukums	Kopējās objekta izmaksas /EUR/
1	1	Kopējie būvdarbi (4.kārtas darbi)	0,00
		Kopā :	0,00
		PVN 21% :	0,00
		Kopā ar PVN:	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja: Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

KOPSAVILKUMA APRĒKINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00
Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta 2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k.	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehān., instr.īre, amortizācija (EUR)	
		4.kārtas darbi					
1	1	Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	Mūra sienas "G" dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOPĀ:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virszdevumi (%)							
Peļņa (%)							
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			0,00				
Kopā bez PVN 21%			0,00				

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:

Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP DOP daļa

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	DOP 1-01													
1	Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu	t/m	45,00											
	"Beakert" inventāra žogs vai ekvivalents	t/m	45,00											
2	Nožogojuma aizklāšana ar plēvi	m2	99,00											
	PVC plēve	m2	108,90											
3	Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku)	t/m	50,00											
4	Būvtafēles izgatavošana, uzstādīšana	kompl	1,00											
5	Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana	kompl	1,00											
6	Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana	kompl	1,00											
7	Ofisa konteineru uzstādīšana, īre	mēn.	2,00											
8	Būvgružu konteineru īre 8.5 m3 (2 mēn.)	gab	1,00											
9	Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja uzstādīšana (~55m)	kompl	1,00											
10	Biotualetes uzstādīšana, īre	mēn.	2,00											
11	Vieta javas sagatavošanai	kompl	1,00											
12	Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana	kompl	1,00											
13	Zemes noseģšana zem sastatnēm un parējā darba zonā	m2	90,00											
	PVC plēve	m2	99,00											
14	Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas	teritorija	1,00											
15	Būvlaukuma uzturēšana 2 mēn.	būvlaukums	1,00											
	KOPA	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur									0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 3

Mūra sienas "G" dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR laika norma c/h darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	Kopā uz visu apjomu EUR darbietilpība c/h darba alga materiāli mehānismi	Summa EUR
	Siena G, Dienvidu fasāde AR3-01;3-03									
	AD1									
1	Mūra kodola attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana	m2	0,74							
2	Mūra kodola papildināšana līdz kodola ārējai plaknei saglabājot mūra nelīdzeno raksturu	m2	0,74							
	Kalkū java	m3	0,08							
3	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķidrumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	0,74							
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķidrums ūdenī vai ekvivalents	l	0,19							
	AD2									
4	Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana	m2	70,47							
5	Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno raksturu	m2	70,47							
	Kalkū java	m3	7,75							
6	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķidrumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	70,47							
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķidrums ūdenī vai ekvivalents	l	17,62							
	BD2									
7	Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana	m2	50,23							
8	Kustīgo akmeņu pārmūrēšana	m2	50,23							
	Kalkū java	m3	5,53							
9	Mūra pāršuvošana ar vāji hidraulisku kalkū grants javu, toni pieskaņojot katra labojuma vietā veidojot dziļi ierautu šuvi	m2	50,23							
	Vāji hidrauliska kalkū grants java	m3	2,76							
10	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķidrumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	50,23							
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķidrums ūdenī vai ekvivalents	l	12,56							
	BD3									
11	Kaltu akmens detaļu attīrīšana, esošā stāvokļa konservācija izmantojot tonētā mākslīgā akmens sastāvu AQUOQ "Petra" vai ekvivalentu	m2	0,42							
	Tonēts mākslīgā akmens sastāvs AQUOQ "Petra" vai ekvivalents	m2	0,42							
12	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķidrumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	0,42							
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķidrums ūdenī vai ekvivalents	l	0,11							
	BK4									
13	Kieģeļu mūra attīrīšana	m2	9,24							
14	Kieģeļu mūra remonts , papildināšana, pāršuvošana ar ierautu šuvi	m2	9,24							



Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	lielzmēra sarkanie māla pilnķieģeļi, piem., Lode "Sencis" vai ekvivalenti	m3	0,92											
	Kaļķu java	m3	1,02											
15	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	9,24											
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķīdums ūdenī vai ekvivalents	l	2,31											
	EZ1													
16	Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm) ar slīpiem slīpetiem galiem iestrādāšana mūra šuvē; to iedzenot urbumā 1/3 no konsoles garuma	vietas	48											
	Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm)	kompl	48											
	EW2													
17	Sastatņu koka vietu attīrīšana, dziļuma uzmērīšana, aiztapošana ar tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni	vieta	15											
	Antiseptizētēts priedes koka aizbāznis	gab	15											
	JJ1													
18	Mūra augšdaļas izlīdzināšana ar kritumu	m2	19,00											
	Kaļķu java	m3	1,05											
19	Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	19,00											
	ģeotekstils "Tippex" vai ekvivalents	m2	20,90											
	māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm	m3	1,90											
	velēna	m2	19,00											
	LA1													
20	Laboratoriskās izpētes veikšana	paraugs	1											
	SAS													
21	Sastatņu montāža, demontāža	m2	429,89											
	inventāra sastatņu tīrē	m2	429,89											
22	Sastatņu zemējuma ierīkošana	kompl	1,00											
23	Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	429,89											
	aizsargtīkls	m2	472,88											
	Kopā:	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiesās izmaksas kopā	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:


E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

5.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienas "A" ziemeļu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (pagalma puse)

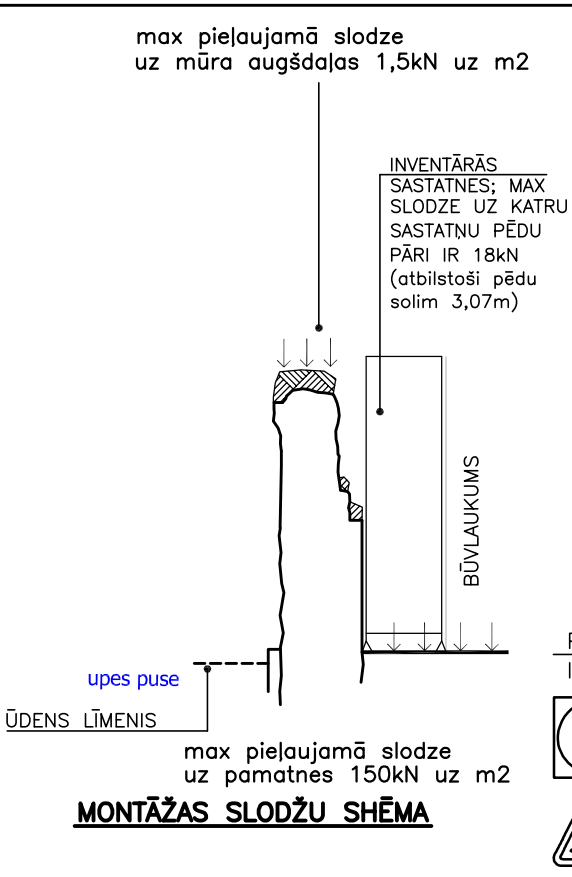

PROJ. SKATU PLATFORMA KOKA KONSTRUKCIJĀS (SKAT. LAPĀ DOP 1–10 "3.KĀRTAS DARBI")

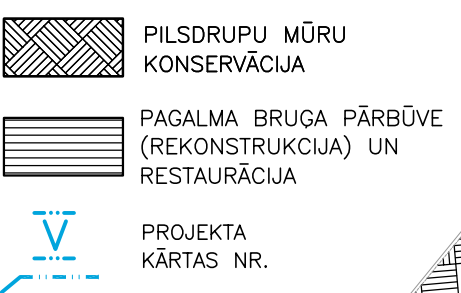

- PIEZĪMES:**
- [1] RASĒJUMAM PAR PAMATU IZMANTOTS 2016.G. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
 - [2] PROJEKTA IETVAROS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS UN SAGATAVOŠANAS DARBIEM NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS SKAT. ŠAJĀ LAPĀ.
 - [3] NORĀDĪJUMUS PAR BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANU UN BŪVDARBU VEIKŠANU SKATĪT DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ.
 - [4] IZMANTOJAMAS SASTATNES, KURAS ATBILST LR MK NOTEIKUMIEM NR. 526 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU UN STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ". NEPIECIEŠAMA 2. SASTATNU KLASĒ AR EJAS PLATUMU 700 MM (KLĀJA MAX NOSLODZE 1,5kN/M2).
 - [5] PIRMS SASTATNU MONTĀŽAS NOSEGT ESOŠO SEGUMU AP PILSDRUPĀM.
 - [6] NOROBEŽOJOŠO ŽOGU AIZKLĀT AR NECAURSPĪDĪGU MATERIĀLU.
 - [7] BŪVLAUKUMĀ ŪDENSAPGĀDE PAREDZĒTA NO DAUGAVAS.
 - [8] UZ OBJEKTAM PIEGULOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSLĒGARMATŪRĀM UN KONTROLĀKĀM AIZLIEGTS IZVIETOT GRŪTI PĀRVIETOJAMUS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA ELEMENTUS (BŪVGROUŽU KONTEINEINERUS U.C.).
 - [9] BŪVPROJEKTĀ BŪVDARBUS IESPĒJAMS SADALĪT ETAPOS, IEVĒROJOT GALVENOS DARBA ORGANIZĀCIJAS PRINCIPUS, KAS NORĀDĪTI SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ UN ŠAJĀ LAPĀ.
 - [10] SASTATNU VIDUSDAĻĀ UN AUGŠĒJĀ DAĻĀ PAREDZĒTAS CILPAS, KAS STIPRINĀTAS MŪRA ŠUVĒS. STARP MŪRI UN SASTATNĒM LIKT MĪKSTU MATERIĀLU (PUTUPOLISTIROLU).
 - [11] LAI PILNĪBĀ TIKTU IZSLĒGTA IZMANTOTO VIELU (CEMENTS, KALKIS U.C.) NOKLŪŠANA DAUGAVAS UN PĒSES UPĒS, MATERIĀLUS GLABĀT TIKAI IEKŠĒJĀ PAGALMĀ. MATERIĀLUS UZGLABĀT UZ PALETĒM, KAS NOVĒROTAS PLĒVES VANNĀS AR ŪDENS SAVĀKŠANU, SAUSUS, ATBILSTOŠI NOSEGTUS.
 - [12] MATERIĀLU PADOŠANA UPES PUSES SIENĀM TIEK RISINĀTA, NO IEKŠPAGALMA PUSES TOS PACELOT AR TRĪŠU MEHĀNISMU LĪDZ ATTIECĢAJAM SASTATNU LĪMENIM, UN, CAUR MŪRĪ ESOŠAJIEM AILU ATVĒRUMIEM, PADODOT TOS UZ UPES PUSES SATATNĒM.
 - [13] SKAT. KOPĀ AR LAPAS DOP 0–01 PIEZĪMĒM.



ESOŠS GRANTĒTS PIEBRAUCAMAIS CELŠ; LIETOJOT CELU, NEBOJĀT ARHITEKTŪRAS PIEMINEKLI

KIOSKS; IESPĒJA PIESLĒGTIES ELEKTROTĪKLAM, UZSTĀDOT UZSKAITES MEZGLU

APZĪMĒJUMS	SPECIFIKĀCIJA – 5.KĀRTAS DARBI	SKAITS
	BŪVTĀFELES IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA, DARBA DROŠĪBAS UN PIRMĀS PALĪDZĪBAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	EVAKUĀCIJAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR PAGaidu INVENTĀRO ŽOGU ("BEKAERT" VAI EKVIVALENTU) UN CELTNIETĪBAS PLĒVI	45 m
	NECAURSPĪDĪGA CELTNIETĪBAS PLĒVE INVENTĀRĀ ŽOGA AIZKLĀŠANAI	99 m2
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR NOROBEŽOJOŠO LENTU (UZ DARBU LAIKU)	111 m
	BŪVMATERIĀLU NOKRAUŠANAS LAUKUMU IZVEIDOŠANA	1 kompl.
	SASTATNU UZSTĀDĪŠANA UN DEMONTĀŽA; INVENTĀRĀS SASTATNES; SASTATNU AIZSARGTĪKLA UZSTĀDĪŠANA	652 m2 (572+80)
	ZEMES NOSEĢŠANA ZEM SASTATNĒM (PAREDZĒTO DARBU ZONĀ) AR ARMĒTU CELTNIETĪBAS PLĒVI PLATUMS 2.0M UN LĪMĒTU KOKŠKIEDRU PLĀTNI 8mm; TERITORIJAS SAKĀRTOŠANA PĒC DARBU PABEIGŠANAS	~150 m2
	SASTATNU ZEMĒJUMA IERĪKOŠANA	2 kompl.
	BIOTUALETES ĪRE UN UZSTĀDĪŠANA (1 GAB.)	2 mēn.
	BŪVGROUŽU KONTEINERA (8,5M3) ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	OFISA (SADZĪVES) KONTEINERA ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA	
	VIETA JAVAS SAGATAVOŠANAI (MATERIĀLU APSTRĀDES VIETA)	1 kompl.
	PAGaidu ELEKTROPĒSLĒGUMS UN SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA, T.SK., PIEVILKŠANA NO ESOŠĀ KIOSKA	1 kompl. ~55 m

	VĒSTURISKO IEEJU VIETAS	
	PIENEMTAIS SIENAS APZĪMĒJUMA BURTS	
	TRANSPORTA KUSTĪBA UZ BŪVLAUKUMU	

PASŪTĪTĀJS:

_____ (VĀRDS, UZVĀRDS)

_____ (IESTĀDE, AMATS)

_____ (DATUMS) _____ (PARAKSTS)


ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKLAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATLĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS **ARTŪRS LAPINŠ** (VĀRDS UN UZVĀRDS)

10-0758 (SERTIFIKĀTA NR.)

_____ DATUMS _____ PARAKSTS

PROJEKTA DAĻĪJUMS KĀRTĀS		
2	(PĒC PASŪTĪTĀJA LŪGUMA)	02.06.2017.
PĒC EKSPERTA NORĀDĒM – JAUNAS PIEZĪMES: NR. 10, 11; MAINĪTA MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA; PRECIZĒTS RASĒJUMA NOSAUKUMS		
1		20.09.2016.
Nr	IZMAIŅAS APRAKSTS	DATUMS

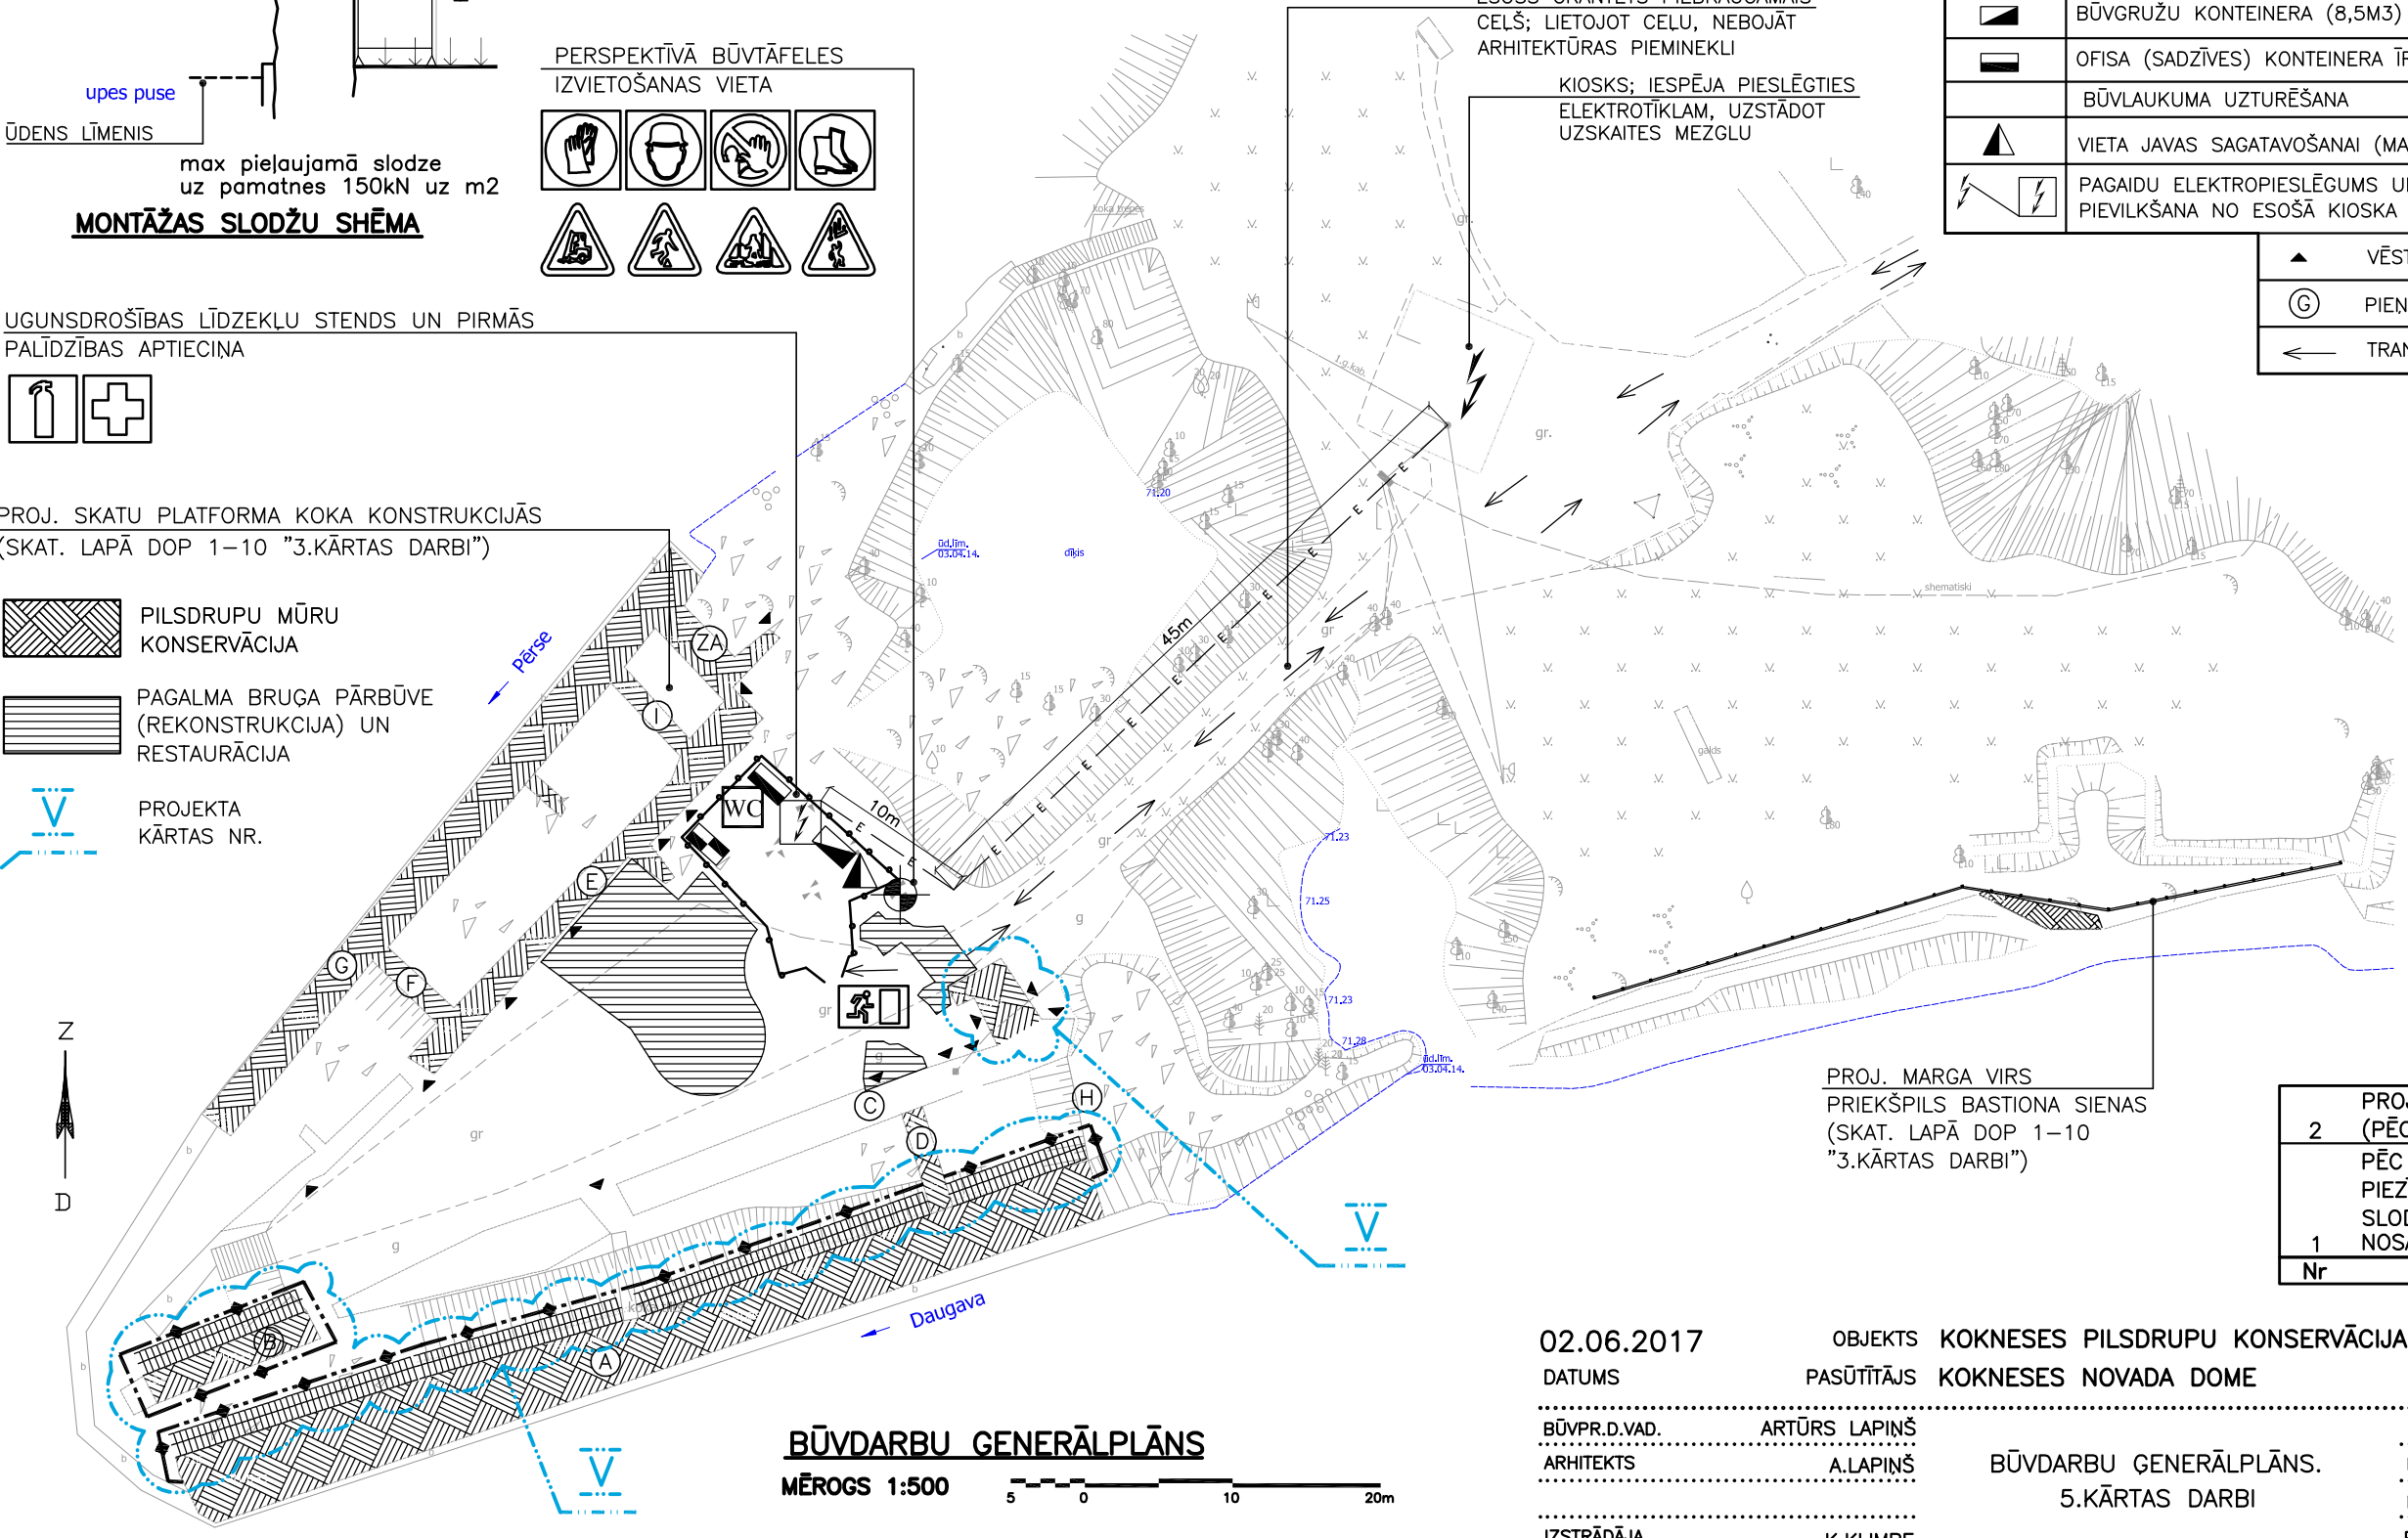

PROJ. MARGA VIRS PRIEKŠPILS BASTIONA SIENAS (SKAT. LAPĀ DOP 1–10 "3.KĀRTAS DARBI")

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

MĒROGS 1:500

5 0 10 20m

02.06.2017
DATUMS

BŪVPR.D.VAD. ARTŪRS LAPINŠ
ARHITEKTS A.LAPINŠ
IZSTRĀDĀJA K.KLIMBE

OBJEKTS KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS
PASŪTĪTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS.
5.KĀRTAS DARBI

STADIJA BP
MARKA DOP
MĒROGS 1:500
PAS.NR. 2017-032 LAPA(S) 1–01–5 IZM. 2

ARHITEKTŌNISKĀS IZPĒTES ARHĪVA NR.

GRUPA SA

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.

____.gada ____ . ____

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%), EUR 0,00
Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Nr.p.k.	Tāmes Nr.	Objekta izmaksu nosaukums	Kopējās objekta izmaksas /EUR/
1	1	Kopējie būvdarbi (5.kārtas darbi)	0,00
		Kopā :	0,00
		PVN 21% :	0,00
		Kopā ar PVN:	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja: Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

KOPSAVILKUMA APRĒKINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00
Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta 2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k.	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehān., instr.īre, amortizācija (EUR)	
		5.kārtas darbi					
1	1	Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5	Mūra sienas «A» ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOPĀ:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virsziedumi (%)							
Peļņa (%)							
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			0,00				
Kopā bez PVN 21%			0,00				

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:

Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP DOP daļa

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	DOP 1-01													
1	Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu	t/m	45,00											
	"Beakert" inventāra žogs vai ekvivalents	t/m	45,00											
2	Nožogojuma aizklāšana ar plēvi	m2	99,00											
	PVC plēve	m2	108,90											
3	Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku)	t/m	111,00											
4	Būvtafēles izgatavošana, uzstādīšana	kompl	1,00											
5	Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana	kompl	1,00											
6	Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana	kompl	1,00											
7	Sadzīves konteineru uzstādīšana, īre	mēn.	2,00											
8	Ofisa konteineru uzstādīšana, īre	mēn.	2,00											
9	Būvgrozu konteineru īre 8.5 m3 (2 mēn.)	gab	1,00											
10	Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja uzstādīšana (~55m)	kompl	1,00											
11	Biotualetes uzstādīšana, īre	mēn.	2,00											
12	Vieta javas sagatavošanai	kompl	1,00											
13	Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana	kompl	1,00											
14	Zemes noseģšana zem sastatnēm un parējā darba zonā	m2	150,00											
	PVC plēve	m2	165,00											
15	Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas	teritorija	1,00											
16	Būvlaukuma uzturēšana 2 mēn.	būvlaukums	1,00											
	KOPA	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrozu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur									0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 5

Mūra sienas «A» ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

[illegible]


Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	EZ1													
13	Balsta stieņa (nerūsējošais tērauds d16mm) ar slīpiem slīpetiem galiem iestrādāšana mūra šuvē; to iedzenot urbumā 1/3 no konsoles garuma	vietas	77											
	Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm)	kompl	77											
	EW2													
	Skat. 6.kārtas darbi													
	JJ1													
	Skat. 6.kārtas darbi													
	SAS (sienai «A»)													
14	Sastatņu montāža, demontāža	m2	572,04											
	inventāra sastatņu īre	m2	572,04											
15	Sastatņu zemējuma ierīkošana	kompl	1,00											
16	Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	572,04											
	aizsargtīkls	m2	629,24											
	SAS (sienai «B»)													
17	Sastatņu montāža, demontāža	m2	80,00											
	inventāra sastatņu īre	m2	80,00											
18	Sastatņu zemējuma ierīkošana	kompl	1,00											
19	Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	80,00											
	aizsargtīkls	m2	88,00											
	Zāliena iesegšana uz sienām AR3-00 (sienai «B» un sienas «C» austrumu gala izvīrzījumam)													
20	Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseguma ieklāšanas, pārmūrējot kustīgās daļas (~0,3 m augstumā kodolam un akmeņu čaulai)	m2	35,00											
	laukakmeņi	m3	0,84											
	baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	0,39											
21	Mūra augšdaļas izlīdzināšana ar kritumu	m2	35,00											
	Kaļķu java	m3	1,93											
22	Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	35,00											
	ģeotekstils "Tiptex" vai ekvivalents	m2	38,50											
	māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm	m3	3,50											
	velēna	m2	35,00											
	Kopā:	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu,būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:


E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

6.KĀRTAS DARBI -



Mūra sienas "A" ziemeļu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (pagalma puse)

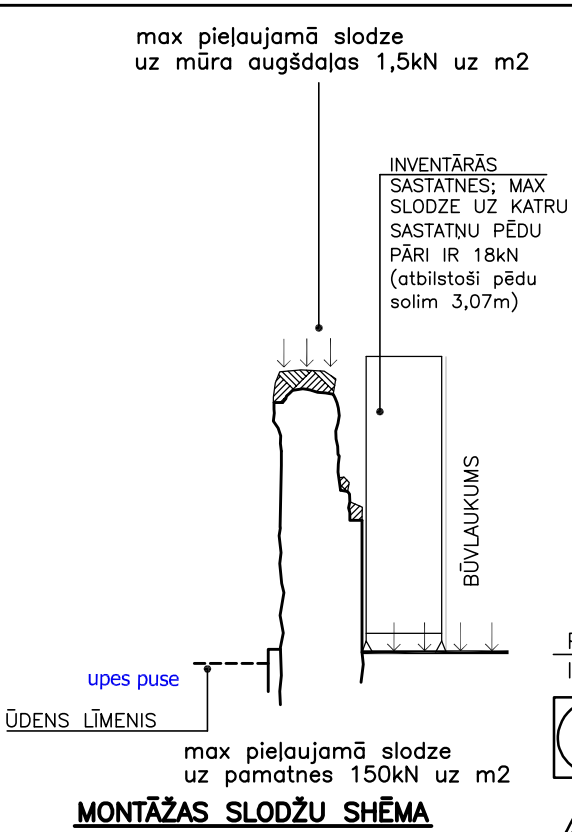

- PIEZĪMES:**
- [1] RASĒJUMAM PAR PAMATU IZMANTOTS 2016.G. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
 - [2] PROJEKTA IETVAROS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS UN SAGATAVOŠANAS DARBIEM NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS SKAT. ŠAJĀ LAPĀ.
 - [3] NORĀDĪJUMUS PAR BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANU UN BŪVDARBU VEIKŠANU SKATĪT DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ.
 - [4] IZMANTOJAMAS SASTATNES, KURAS ATBILST LR MK NOTEIKUMIEM NR. 526 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU UN STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ". NEPIECIEŠAMA 2. SASTATNU KLASĒ AR EJAS PLATUMU 700 MM (KLĀJA MAX NOSLODZE 1,5kN/M2).
 - [5] PIRMS SASTATNU MONTĀŽAS NOSEGT ESOŠO SEGUMU AP PILSDRUPĀM.
 - [6] NOROBEŽOJOŠO ŽOGU AIZKLĀT AR NECAURSPĪDĪGU MATERIĀLU.
 - [7] BŪVLAUKUMĀ ŪDENSAPGĀDE PAREDZĒTA NO DAUGAVAS.
 - [8] UZ OBJEKTAM PIEGULOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSLĒGARMATŪRĀM UN KONTROLAKĀM AIZLIEGTS IZVIETOT GRŪTI PĀRVIETOJAMUS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA ELEMENTUS (BŪVGRUŽU KONTEINEINERUS U.C.).
 - [9] BŪVPROJEKTĀ BŪVDARBUS IESPĒJAMS SADALĪT ETAPOS, IEVĒROJOT GALVENOS DARBA ORGANIZĀCIJAS PRINCIPUS, KAS NORĀDĪTI SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ UN ŠAJĀ LAPĀ.
 - [10] SASTATNU VIDUSDAĻĀ UN AUGŠĒJĀ DAĻĀ PAREDZĒTAS CILPAS, KAS STIPRINĀTAS MŪRA ŠUVĒS. STARP MŪRI UN SASTATNĒM LIKT MĪKSTU MATERIĀLU (PUTUPOLISTIROLU).
 - [11] LAI PILNĪBĀ TIKTU IZSLĒGTA IZMANTOTO VIELU (CEMENTS, KALKIS U.C.) NOKLŪŠANA DAUGAVAS UN PĒSES UPĒS, MATERIĀLUS GLABĀT TIKAI IEKŠĒJĀ PAGALMĀ. MATERIĀLUS UZGLABĀT UZ PALETĒM, KAS NOVĒROTAS PLĒVES VANNĀS AR ŪDENS SAVĀKŠANU, SAUSUS, ATBILSTOŠI NOSEGTUS.
 - [12] MATERIĀLU PADOŠANA UPES PUSES SIENĀM TIEK RISINĀTA, NO IEKŠPAGALMA PUSES TOS PACELOT AR TRĪŠU MEHĀNISMU LĪDZ ATTIECĪGĀJAM SASTATNU LĪMENIM, UN, CAUR MŪRĪ ESOŠAJIEM AILU ATVĒRUMIEM, PADODOT TOS UZ UPES PUSES SATATNĒM.
 - [13] SKAT. KOPĀ AR LAPAS DOP 0-01 PIEZĪMĒM.



PROJ. SKATU PLATFORMA KOKA KONSTRUKCIJĀS (SKAT. LAPĀ DOP 1-10 "3.KĀRTAS DARBI")

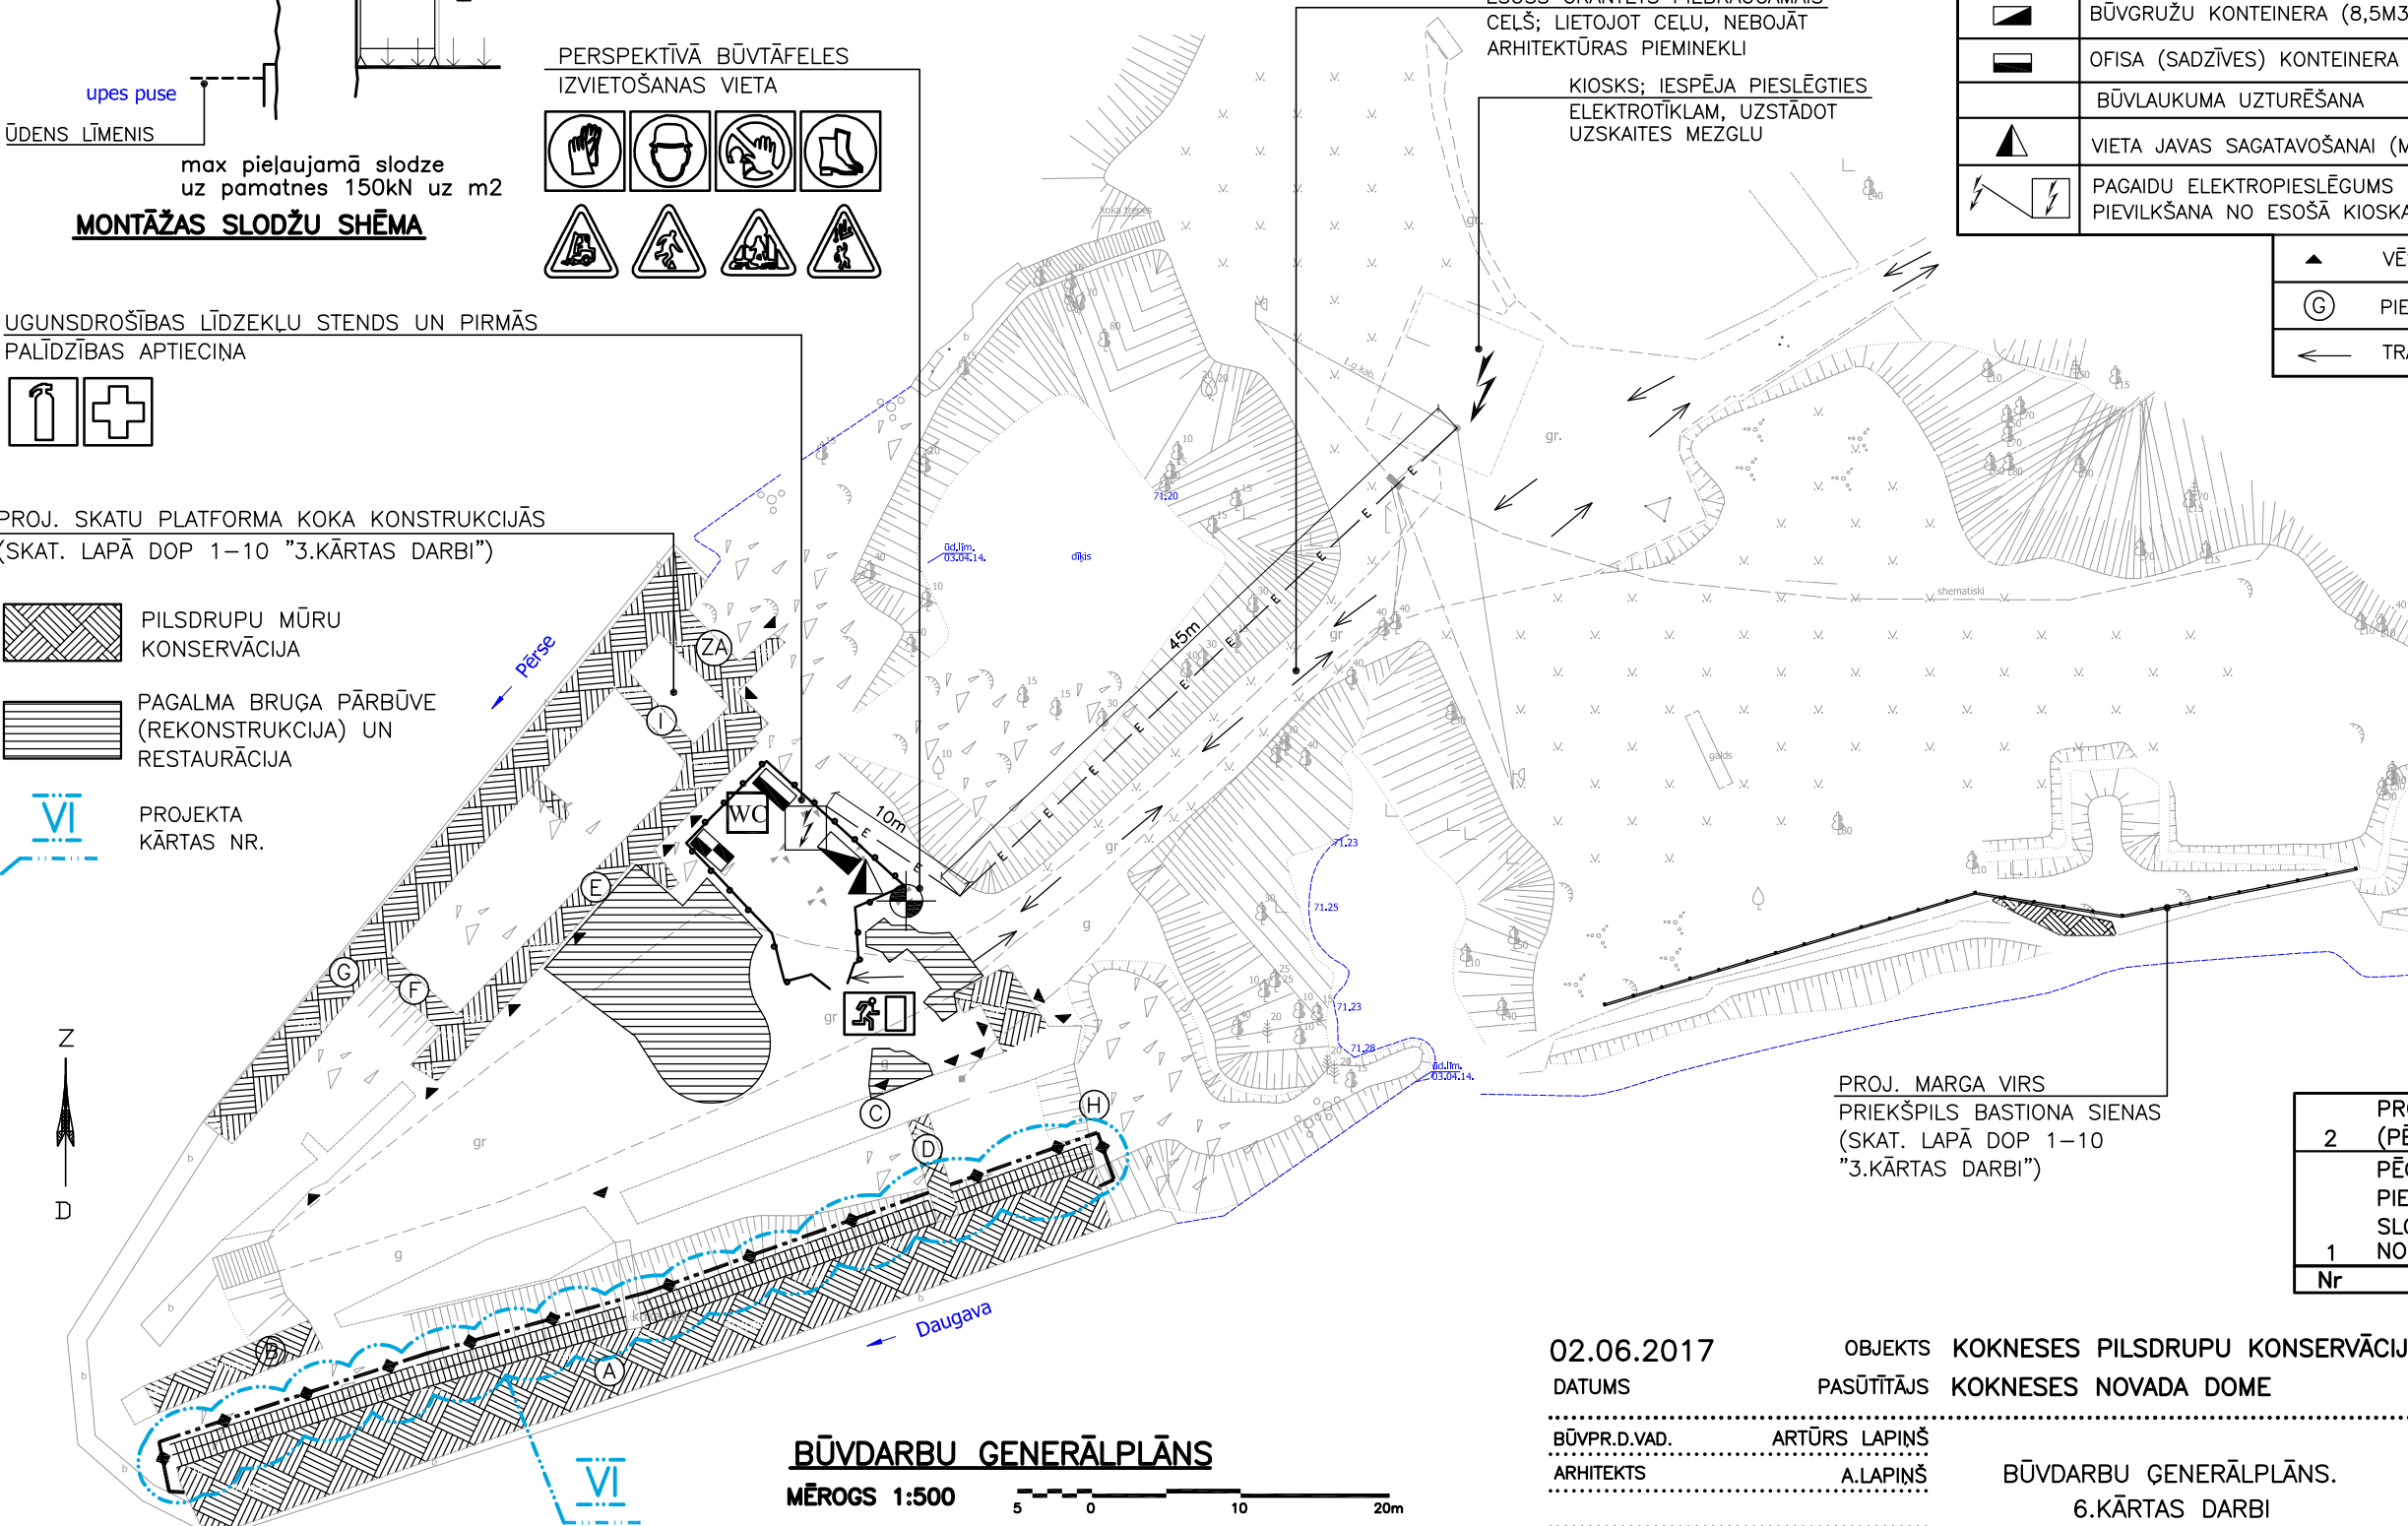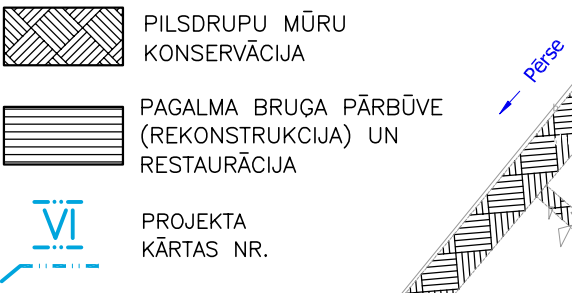

ESOŠS GRANTĒTS PIEBRAUCAMAIS CELŠ; LIETOJOT CELU, NEBOJĀT ARHITEKTŪRAS PIEMINEKLI

KIOSKS; IESPĒJA PIESLĒGTIES ELEKTROTĪKLAM, UZSTĀDOT UZSKAITES MEZGLU

PROJ. MARGA VIRS PRIEKŠPILS BASTIONA SIENAS (SKAT. LAPĀ DOP 1-10 "3.KĀRTAS DARBI")

APZĪMĒJUMS	SPECIFIKĀCIJA – 6.KĀRTAS DARBI	SKAITS
	BŪVTĀFELES IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA, DARBA DROŠĪBAS UN PIRMĀS PALĪDZĪBAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	EVAKUĀCIJAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR PAGaidu INVENTĀRO ŽOGU ("BEKAERT" VAI EKVIVALENTU) UN CELTNIETĪBAS PLĒVI	45 m
	NECAURSPĪDĪGA CELTNIETĪBAS PLĒVE INVENTĀRĀ ŽOGA AIZKLĀŠANAI	99 m2
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR NOROBEŽOJOŠO LENTU (UZ DARBU LAIKU)	75 m
	BŪVMATERIĀLU NOKRAUŠANAS LAUKUMU IZVEIDOŠANA	1 kompl.
	SASTATNU UZSTĀDĪŠANA UN DEMONTĀŽA; INVENTĀRĀS SASTATNES; SASTATNU AIZSARGTĪKLA UZSTĀDĪŠANA	572 m2
	ZEMES NOSEĢŠANA ZEM SASTATNĒM (PAREDZĒTO DARBU ZONĀ) AR ARMĒTU CELTNIETĪBAS PLĒVI PLATUMS 2.0M UN LĪMĒTU KOKŠKIEDRU PLĀTNI 8mm; TERITORIJAS SAKĀRTOŠANA PĒC DARBU PABEIGŠANAS	~150 m2
	SASTATNU ZEMĒJUMA IERĪKOŠANA	1 kompl.
	BIOTUALETES ĪRE UN UZSTĀDĪŠANA (1 GAB.)	2 mēn.
	BŪVGRUŽU KONTEINERA (8,5M3) ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	OFISA (SADZĪVES) KONTEINERA ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA	
	VIETA JAVAS SAGATAVOŠANAI (MATERIĀLU APSTRĀDES VIETA)	1 kompl.
	PAGaidu ELEKTROPIESLĒGUMS UN SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA, T.SK., PIEVILKŠANA NO ESOŠĀ KIOSKA	1 kompl. ~55 m

	VĒSTURISKO IEEJU VIETAS	
	PIENEMTAIS SIENAS APZĪMĒJUMA BURTS	
	TRANSPORTA KUSTĪBA UZ BŪVLAUKUMU	

PASŪTĪTĀJS:

_____ (VĀRDS, UZVĀRDS)

_____ (IESTĀDE, AMATS)

_____ (DATUMS) _____ (PARAKSTS)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKLAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATLĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS **ARTŪRS LAPINŠ** (VĀRDS UN UZVĀRDS)

10-0758 (SERTIFIKĀTA NR.)

_____ DATUMS _____ PARAKSTS

PROJEKTA DAĻĪJUMS KĀRTĀS		
2	(PĒC PASŪTĪTĀJA LŪGUMA)	02.06.2017.
PĒC EKSPERTA NORĀDĒM – JAUNAS PIEZĪMES: NR. 10, 11; MAINĪTA MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA; PRECIZĒTS RASĒJUMA NOSAUKUMS		
1		20.09.2016.
Nr	IZMAIŅAS APRAKSTS	DATUMS

02.06.2017
DATUMS

BŪVPR.D.VAD. ARTŪRS LAPINŠ
ARHITEKTS A.LAPINŠ
IZSTRĀDĀJA K.KLIMBE

OBJEKTS KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS
PASŪTĪTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS.
6.KĀRTAS DARBI

STADIJA BP
MARKA DOP
MĒROGS 1:500
PAS.NR. 2017-032 LAPA(S) 1-01-6 IZM. 2

ARHITEKTŌNISKĀS IZPĒTES ARHĪVA NR.

GRUPA

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

____.gada ____ . _____

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%), EUR 0,00
Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Nr.p.k.	Tāmes Nr.	Objekta izmaksu nosaukums	Kopējās objekta izmaksas /EUR/
1	1	Kopējie būvdarbi (6.kārtas darbi)	0,00
		Kopā :	0,00
		PVN 21% :	0,00
		Kopā ar PVN:	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja: Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

KOPSAVILKUMA APRĒKINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00
Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta 2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k.	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehān., instr.īre, amortizācija (EUR)	
		6.kārtas darbi					
1	1	Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5	Mūra sienas «A» ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOPĀ:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virszdevumi (%)							
Peļņa (%)							
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			0,00				
Kopā bez PVN 21%			0,00				

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:

Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP DOP daļa

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	DOP 1-01													
1	Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu	t/m	45,00											
	"Beakert" inventāra žogs vai ekvivalents	t/m	45,00											
2	Nožogojuma aizklāšana ar plēvi	m2	99,00											
	PVC plēve	m2	108,90											
3	Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku)	t/m	75,00											
4	Būvtafēles izgatavošana, uzstādīšana	kompl	1,00											
5	Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana	kompl	1,00											
6	Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana	kompl	1,00											
7	Sadzīves konteineru uzstādīšana, īre	mēn.	2,00											
8	Ofisa konteineru uzstādīšana, īre	mēn.	2,00											
9	Būvgrozu konteineru īre 8.5 m3 (2 mēn.)	gab	1,00											
10	Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja uzstādīšana (~55m)	kompl	1,00											
11	Biotualetes uzstādīšana, īre	mēn.	2,00											
12	Vieta javas sagatavošanai	kompl	1,00											
13	Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana	kompl	1,00											
14	Zemes noseģšana zem sastatnēm un parējā darba zonā	m2	150,00											
	PVC plēve	m2	165,00											
15	Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas	teritorija	1,00											
16	Būvlaukuma uzturēšana 2 mēn.	būvlaukums	1,00											
	KOPA	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrozu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur									0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 5

Mūra sienas «A» ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Tāmes izmaksas, EUR: **0,00**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	Siena A, Ziemeļu fasāde AR3-01;3-05													
	AD2													
1	Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana	m2	268,15											
2	Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno raksturu	m2	268,15											
	Kaļķu java	m3	29,50											
3	Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA "Porosil ZTS" šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu	m2	268,15											
	Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA "Porosil ZTS" šķīdums ūdenī vai ekvivalents	l	67,04											
	BD1													
	Skat. 5.kārtas darbi													
	BD2													
	Skat. 5.kārtas darbi													
	BD3													
	Skat. 5.kārtas darbi													
	BK4													
	Skat. 5.kārtas darbi													
	EZ1													
	Skat. 5.kārtas darbi													
	EW2													
4	Sastatņu koka vietu attīrīšana, dziļuma uzmērīšana, aiztapošana ar tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni	vieta	33											
	Antiseptizētēts priedes koka aizbāznis	gab	33											
	JJ1													
5	Mūra augšdaļas izlīdzināšana ar kritumu	m2	41,00											
	Kaļķu java	m3	2,26											
6	Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	41,00											
	ģeotekstils "Tiptex" vai ekvivalents	m2	45,10											
	māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm	m3	4,10											
	velēna	m2	41,00											
	SAS													
7	Sastatņu montāža, demontāža	m2	572,04											
	inventāra sastatņu īre	m2	572,04											
8	Sastatņu zemējuma ierīkošana	kompl	1,00											
9	Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	572,04											
	aizsargtīkls	m2	629,24											
	Kopā:	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu,būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

7.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienas "F" ziemeļu un dienvidu fasādes
konstrukciju konservācijas darbi


max pieļaujamā slodze
uz mūra augšdaļas 1,5kN uz m2

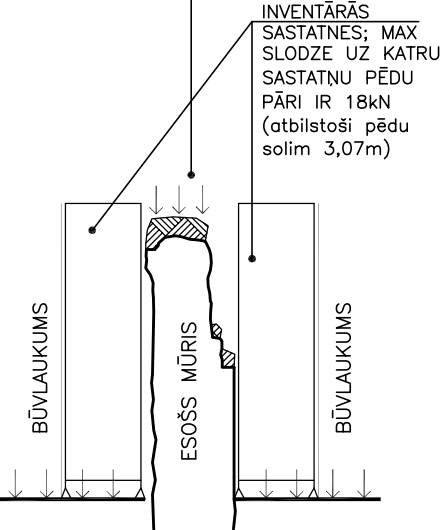

max pieļaujamā slodze
uz pamatnes 150kN uz m2

MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA

UGUNSDROŠĪBAS LĪDZEKĻU STENDS UN PIRMĀS
PALĪDZĪBAS APTIECIŅA



PROJ. SKATU PLATFORMA KOKA KONSTRUKCIJĀS
(SKAT. LAPĀ DOP 1–10 "3.KĀRTAS DARBI")

PILSDRUPU MŪRU
KONSERVĀCIJA

PAGALMA BRUGA PĀRBŪVE
(REKONSTRUKCIJA) UN
RESTAURĀCIJA

PROJEKTA
KĀRTAS NR.

PIEZĪMES:

- [1] RASĒJUMAM PAR PAMATU IZMANTOTS 2016.G. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
- [2] PROJEKTA IETVAROS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS UN SAGATAVOŠANAS DARBIEM NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS SKAT. ŠAJĀ LAPĀ.
- [3] NORĀDĪJUMUS PAR BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANU UN BŪVDARBU VEIKŠANU SKATĪT DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ.
- [4] IZMANTOJAMAS SASTATNES, KURAS ATBILST LR MK NOTEIKUMIEM NR. 526 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU UN STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ". NEPIECIEŠAMA 2. SASTATNU KLASĒ AR EJAS PLATUMU 700 MM (KLĀJA MAX NOSLODZE 1,5kN/M2).
- [5] PIRMS SASTATNU MONTĀŽAS NOSEGT ESOŠO SEGUMU AP PILSDRUPĀM.
- [6] NOROBEŽOJOŠO ŽOGU AIZKLĀT AR NECAURSPĪDĪGU MATERIĀLU.
- [7] BŪVLAUKUMĀ ŪDENSAPGĀDE PAREDZĒTA NO DAUGAVAS.
- [8] UZ OBJEKTAM PIEGULOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSLĒGARMATŪRĀM UN KONTROLAKĀM AIZLIEGTS IZVIETOT GRŪTI PĀRVIETOJAMUS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA ELEMENTUS (BŪVGROUŽU KONTEINEINERUS U.C.).
- [9] BŪVPROJEKTĀ BŪVDARBUS IESPĒJAMS SADALĪT ETAPOS, IEVĒROJOT GALVENOS DARBA ORGANIZĀCIJAS PRINCIPUS, KAS NORĀDĪTI SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ UN ŠAJĀ LAPĀ.
- [10] SASTATNU VIDUSDAĻĀ UN AUGŠĒJĀ DAĻĀ PAREDZĒTAS CILPAS, KAS STIPRINĀTAS MŪRA ŠŪVĒS. AILU VIETĀS SASTATNES SAVSTARPĒJI SASTIPRINĀT. AUGŠDAĻĀ SASTATNES SIENU ABĀS PUSĒS SAVILKT (SASTIPRINĀT KOPĀ).STARP MŪRI UN SASTATNĒM LIKT MĪKSTU MATERIĀLU (PUTUPOLISTIROLU).
- [11] LAI PILNĪBĀ TIKTU IZSLĒGTA IZMANTOTO VIELU (CEMENTS, KALKIS U.C.) NOKLŪŠANA DAUGAVAS UN PĒRSES UPĒS, MATERIĀLUS GLABĀT TIKAI IEKŠĒJĀ PAGALMĀ. MATERIĀLUS UZGLABĀT UZ PALETĒM, KAS NOVĪETOTAS PLĒVES VANNĀS AR ŪDENS SAVĀKŠANU, SAUSUS, ATBILSTOŠI NOSEGTUS.
- [12] MATERIĀLU PADOŠANA UPES PUSES SIENĀM TIEK RISINĀTA, NO IEKŠPAGALMA PUSES TOS PACELOT AR TRĪŠU MEHĀNISMU LĪDZ ATTIECĪGAJAM SASTATNU LĪMENIM, UN, CAUR MŪRĪ ESOŠAJIEM AILU ATVĒRUMIEM, PADODOT TOS UZ UPES PUSES SATATNĒM.
- [13] SKAT. KOPĀ AR LAPAS DOP 0–01 PIEZĪMĒM.

PERSPEKTĪVĀ BŪVTĀFELES
IZVIETOŠANAS VIETA



ESOŠS GRANTĒTS PIEBRAUCAMAIS
CELŠ; LIETOJOT CELU, NEBOJĀT
ARHITEKTŪRAS PIEMINEKLI

KIOSKS; IESPĒJA PIESLĒGTIES
ELEKTROTĪKLAM, UZSTĀDOT
UZSKAITES MEZGLU

APZĪMĒJUMS	SPECIFIKĀCIJA – 7.KĀRTAS DARBI	SKAITS
	BŪVTĀFELES IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA, DARBA DROŠĪBAS UN PIRMĀS PALĪDZĪBAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	EVAKUĀCIJAS ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA	1 kompl.
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR PAGaidu INVENTĀRO ŽOGU ("BEKAERT" VAI EKVIVALENTU) UN CELTNIETĪBAS PLĒVI	45 m
	NECAURSPĪDĪGA CELTNIETĪBAS PLĒVE INVENTĀRĀ ŽOGA AIZKLĀŠANAI	99 m2
	TERITORIJAS NOROBEŽOŠANA AR NOROBEŽOJOŠO LENTU (UZ DARBU LAIKU)	13 m
	BŪVMATERIĀLU NOKRAUŠANAS LAUKUMU IZVEIDOŠANA	1 kompl.
	SASTATNU UZSTĀDĪŠANA UN DEMONTĀŽA; INVENTĀRĀS SASTATNES; SASTATNU AIZSARGTĪKLA UZSTĀDĪŠANA	151,2 m2
	ZEMES NOSEĢŠANA ZEM SASTATNĒM (PAREDZĒTO DARBU ZONĀ) AR ARMĒTU CELTNIETĪBAS PLĒVI PLATUMS 2.0M UN LĪMĒTU KOKŠKIEDRU PLĀTNI 8mm; TERITORIJAS SAKĀRTOŠANA PĒC DARBU PABEIGŠANAS	~26 m2
	SASTATNU ZEMĒJUMA IERĪKOŠANA	2 kompl.
	BIOTUALETES ĪRE UN UZSTĀDĪŠANA (1 GAB.)	1 mēn.
	BŪVGROUŽU KONTEINERA (8,5M3) ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	OFISA (SADZĪVES) KONTEINERA ĪRE (1 GAB.) UN UZSTĀDĪŠANA	
	BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA	
	VIETA JAVAS SAGATAVOŠANAI (MATERIĀLU APSTRĀDES VIETA)	1 kompl.
	PAGaidu ELEKTROPĪESLĒGUMS UN SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA, T.SK., PIEVILKŠANA NO ESOŠĀ KIOSKA	1 kompl. ~55 m

	VĒSTURISKO IEEJU VIETAS	
	PIENEMTAIS SIENAS APZĪMĒJUMA BURTS	
	TRANSPORTA KUSTĪBA UZ BŪVLAUKUMU	

PASŪTĪTĀJS:

(VĀRDS, UZVĀRDS)
(IESTĀDE, AMATS)
(DATUMS) (PARAKSTS)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKLAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS
VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI
BŪVATLĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA
VADĪTĀJS **ARTŪRS LAPINŠ**
(VĀRDS UN UZVĀRDS)
10-0758
(SERTIFIKĀTA NR.)
DATUMS PARAKSTS

PROJEKTA DAĻĪJUMS KĀRTĀS	
2 (PĒC PASŪTĪTĀJA LŪGUMA)	02.06.2017.
PĒC EKSPERTA NORĀDĒM – JAUNAS PIEZĪMES: NR. 10, 11; MAINĪTA MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA; PRECIZĒTS RASĒJUMA	
1 NOSAUKUMS	20.09.2016.
Nr IZMAIŅAS APRAKSTS	DATUMS

02.06.2017
DATUMS

OBJEKTS KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS
PASŪTĪTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

BŪVPR.D.VAD. ARTŪRS LAPINŠ
ARHITEKTS A.LAPINŠ

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS.
7.KĀRTAS DARBI

STADIJA BP
MARKA DOP
MĒROGS 1:500
PAS.NR. 2017-032 LAPA(S) 1–01–7 IZM. 2

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

MĒROGS 1:500

5 0 10 20m



(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

____.gada ____ . _____

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%), EUR 0,00
Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Nr.p.k.	Tāmes Nr.	Objekta izmaksu nosaukums	Kopējās objekta izmaksas /EUR/
1	1	Kopējie būvdarbi (7.kārtas darbi)	0,00
		Kopā :	0,00
		PVN 21% :	0,00
		Kopā ar PVN:	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja: Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

KOPSAVILKUMA APRĒKINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00
Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta 2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k.	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehān., instr.īre, amortizācija (EUR)	
		7.kārtas darbi					
1	1	Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	Mūra sienas «F» ziemeļu un dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOPĀ:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virszdevumi (%)							
Peļņa (%)							
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			0,00				
Kopā bez PVN 21%			0,00				

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:

Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP DOP daļa

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	DOP 1-01													
1	Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu	t/m	45,00											
	"Beakert" inventāra žogs vai ekvivalents	t/m	45,00											
2	Nožogojuma aizklāšana ar plēvi	m2	99,00											
	PVC plēve	m2	108,90											
3	Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku)	t/m	13,00											
4	Būvtafeles izgatavošana, uzstādīšana	kompl	1,00											
5	Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana	kompl	1,00											
6	Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana	kompl	1,00											
7	Sadzīves konteinera uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
8	Ofisa konteinera uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
9	Būvgrozu konteinera īre 8.5 m3 (1 mēn.)	gab	1,00											
10	Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja uzstādīšana (~55m)	kompl	1,00											
11	Biotualetes uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
12	Vieta javas sagatavošanai	kompl	1,00											
13	Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana	kompl	1,00											
14	Zemes noseģšana zem sastatnēm un parējā darba zonā	m2	26,00											
	PVC plēve	m2	28,60											
15	Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas	teritorija	1,00											
16	Būvlaukuma uzturēšana 1 mēn.	būvlaukums	1,00											
	KOPA	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrozu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur									0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Mūra sienas «F» ziemeļu un dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

0.00

[illegible]

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
14	Sastatņu zemējuma ierīkošana	kompl	2,00											
15	Aizsargtīkļa uzstādīšana	m2	151,16											
	aizsargtīklis	m2	166,28											
	Zāliena iesegšana uz sienām AR3-00													
16	Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseguma ieklāšanas, pārmūrējot kustīgās daļas (~0,3 m augstumā kodolam un akmeņu čaulai)	m2	8,00											
	laukakmeņi	m3	0,19											
	baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	0,09											
17	Mūra augšdaļas izlīdzināšana ar kritumu	m2	8,00											
	Kaļķu java	m3	0,44											
18	Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	8,00											
	ģeotekstils "Tipptex" vai ekvivalents	m2	8,80											
	māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm	m3	0,80											
	velēna	m2	8,00											
	Kopā:	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu,būvgružu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Sastādīja:

E.Pētersons
sertif.Nr 20-3506

8.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienu "E", "I" un "ZA" fasāžu konstrukciju
konservācijas darbi


max pieļaujamā slodze
uz mūra augšdaļas 1,5kN uz m2

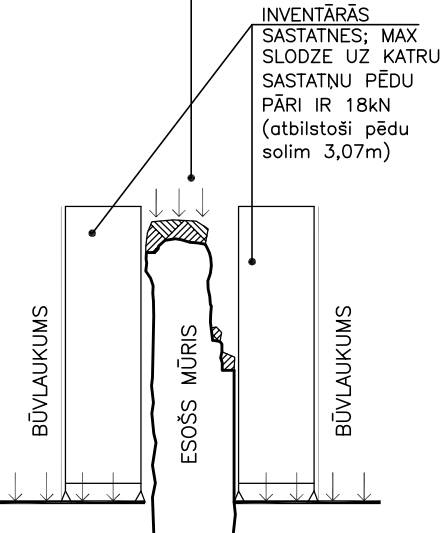

max pieļaujamā slodze
uz pamatnes 150kN uz m2

MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA

UGUNSDROŠĪBAS LĪDZEKĻU STENDS UN PIRMĀS
PALĪDZĪBAS APTIECIŅA



PROJ. SKATU PLATFORMA KOKA KONSTRUKCIJĀS
(SKAT. LAPĀ DOP 1–10 "3.KĀRTAS DARBI")

PILSDRUPU MŪRU
KONSERVĀCIJA

PAGALMA BRUGA PĀRBŪVE
(REKONSTRUKCIJA) UN
RESTAURĀCIJA

PROJEKTA
KĀRTAS NR.



PIEZĪMES:

- [1] RASĒJUMAM PAR PAMATU IZMANTOTS 2016.G. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
- [2] PROJEKTA IETVAROS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS UN SAGATAVOŠANAS DARBIEM NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS SKAT. ŠAJĀ LAPĀ.
- [3] NORĀDĪJUMUS PAR BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANU UN BŪVDARBU VEIKŠANU SKATĪT DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ.
- [4] IZMANTOJAMAS SASTATNES, KURAS ATBILST LR MK NOTEIKUMIEM NR. 526 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU UN STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ". NEPIECIEŠAMA 2. SASTATNU KLASĒ AR EJAS PLATUMU 700 MM (KLĀJA MAX NOSLODZE 1,5kN/M2).
- [5] PIRMS SASTATNU MONTĀŽAS NOSEGT ESOŠO SEGUMU AP PILSDRUPĀM.
- [6] NOROBEŽOJOŠO ŽOGU AIZKLĀT AR NECAURSPĪDĪGU MATERIĀLU.
- [7] BŪVLAUKUMĀ ŪDENSAPGĀDE PAREDZĒTA NO DAUGAVAS.
- [8] UZ OBJEKTAM PIEGULOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSLĒGARMATŪRĀM UN KONTROLAKĀM AIZLIEGTS IZVIETOT GRŪTI PĀRVIETOJAMUS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA ELEMENTUS (BŪVGROZU KONTEINEINERUS U.C.).
- [9] BŪVPROJEKTĀ BŪVDARBUS IESPĒJAMS SADALĪT ETAPOS, IEVĒROJOT GALVENOS DARBA ORGANIZĀCIJAS PRINCIPUS, KAS NORĀDĪTI SKAIDROJOŠĀ APRAKSTĀ UN ŠAJĀ LAPĀ.
- [10] SASTATNU VIDUSDAĻĀ UN AUGŠĒJĀ DAĻĀ PAREDZĒTAS CILPAS, KAS STIPRINĀTAS MŪRA ŠŪVĒS. AILU VIETĀS SASTATNES SAVSTARPĒJI SASTIPRINĀT. AUGŠDAĻĀ SASTATNES SIENU ABĀS PUSĒS SAVILKT (SASTIPRINĀT KOPĀ).STARP MŪRI UN SASTATNĒM LIKT MĪKSTU MATERIĀLU (PUTUPOLISTIROLU).
- [11] LAI PILNĪBĀ TIKTU IZSLĒGTA IZMANTOTO VIELU (CEMENTS, KALKIS U.C.) NOKLŪŠANA DAUGAVAS UN PĒRSES UPĒS, MATERIĀLUS GLABĀT TIKAI IEKŠĒJĀ PAGALMĀ. MATERIĀLUS UZGLABĀT UZ PALETĒM, KAS NOVĒTAS PLĒVES VANNĀS AR ŪDENS SAVĀKŠANU, SAUSUS, ATBILSTOŠI NOSEGTUS.
- [12] MATERIĀLU PADOŠANA UPES PUSES SIENĀM TIEK RISINĀTA, NO IEKŠPAGALMA PUSES TOS PACELOT AR TRĪŠU MEHĀNISMU LĪDZ ATTIECĪGĀJAM SASTATNU LĪMENIM, UN, CAUR MŪRĪ ESOŠAJIEM AILU ATVĒRUMIEM, PADODOT TOS UZ UPES PUSES SATATNĒM.
- [13] SKAT. KOPĀ AR LAPAS DOP 0–01 PIEZĪMĒM.

PERSPEKTĪVĀ BŪVTĀFELES
IZVIETOŠANAS VIETA



ESOŠS GRANTĒTS PIEBRAUCAMAIS
CELŠ; LIETOJOT CELU, NEBOJĀT
ARHITEKTŪRAS PIEMINEKLI

KIOSKS; IESPĒJA PIESLĒGTIES
ELEKTROTĪKLAM, UZSTĀDOT
UZSKAITES MEZGLU

PROJ. MARGA VIRS
PRIEKŠPILS BASTIONA SIENAS
(SKAT. LAPĀ DOP 1–10
"3.KĀRTAS DARBI")

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

MĒROGS 1:500



02.06.2017

DATUMS

OBJEKTS KOKNESES PILSDRUPU KONSERVĀCIJA UN LABIEKĀRTOJUMS

PASŪTĪTĀJS KOKNESES NOVADA DOME

BŪVPR.D.VAD. ARTŪRS LAPINŠ

ARHITEKTS A.LAPINŠ

IZSTRĀDĀJA K.KLIMBE

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS.

8.KĀRTAS DARBI

STADIJA BP


MARKA DOP

MĒROGS 1:500

PAS.NR. 2017-032

ARHITEKTŌNISKĀS IZPĒTES

ARHĪVA NR. 1-01-8 IZM. 2



PASŪTĪTĀJS:

(VĀRDS, UZVĀRDS)

(IESTĀDE, AMATS)

(DATUMS)

(PARAKSTS)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKLAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS
VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI
BŪVATLĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA
VADĪTĀJS

ARTŪRS LAPINŠ
(VĀRDS UN UZVĀRDS)

10-0758

(SERTIFIKĀTA NR.)

DATUMS

PARAKSTS

PROJEKTA DAĻĪJUMS KĀRTĀS
2 (PĒC PASŪTĪTĀJA LŪGUMA) 02.06.2017.

PĒC EKSPERTA NORĀDĒM – JAUNAS
PIEZĪMES: NR. 10, 11; MAINĪTA MONTĀŽAS
SLODŽU SHĒMA; PRECIZĒTS RASĒJUMA
1 NOSAUKUMS 20.09.2016.

Nr IZMAIŅAS APRAKSTS DATUMS

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

____.gada ____ . ____

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%), EUR 0,00
Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Nr.p.k.	Tāmes Nr.	Objekta izmaksu nosaukums	Kopējās objekta izmaksas /EUR/
1	1	Kopējie būvdarbi (8.kārtas darbi)	0,00
		Kopā :	0,00
		PVN 21% :	0,00
		Kopā ar PVN:	0,00

Sastādīja: E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja: Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

KOPSAVILKUMA APRĒKINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00
Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta 2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k.	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehān., instr.īre, amortizācija (EUR)	
		8.kārtas darbi					
1	1	Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	Mūra sienu E, I un ZA fasādes konstrukciju konservācijas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOPĀ:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virszdevumi (%)							
Peļņa (%)							
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			0,00				
Kopā bez PVN 21%			0,00				

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:

Būvproj. vad.: A. Lapiņš
sertf.Nr. 10-0758

Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums
PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP DOP daļa

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas EUR						Kopā uz visu apjomu EUR				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	materiāli	mehānismi	kopā	darbietilpība c/h	darba alga	materiāli	mehānismi	Summa EUR
	DOP 1-01													
1	Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu	t/m	45,00											
	"Beakert" inventāra žogs vai ekvivalents	t/m	45,00											
2	Nožogojuma aizklāšana ar plēvi	m2	99,00											
	PVC plēve	m2	108,90											
3	Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku)	t/m	55,00											
4	Būvtafeles izgatavošana, uzstādīšana	kompl	1,00											
5	Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana	kompl	1,00											
6	Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana	kompl	1,00											
7	Sadzīves konteinera uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
8	Ofisa konteinera uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
9	Būvgrožu konteinera īre 8.5 m3 (1 mēn.)	gab	1,00											
10	Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja uzstādīšana (~55m)	kompl	1,00											
11	Biotualetes uzstādīšana, īre	mēn.	1,00											
12	Vieta javas sagatavošanai	kompl	1,00											
13	Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana	kompl	1,00											
14	Zemes noseģšana zem sastatnēm un parējā darba zonā	m2	34,00											
	PVC plēve	m2	37,40											
15	Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas	teritorija	1,00											
16	Būvlaukuma uzturēšana 1 mēn.	būvlaukums	1,00											
	KOPA	Eur								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrožu transporta izdevumi	%										0,00		0,00
	Tiešās izmaksas kopā	Eur									0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506

Pamatojums: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" BP AR daļa
SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās

Mūra sienu E. I un ZA fasādes konstrukciju konservācijas darbi

0.00

Sastādīja:

E.Pētersons
sertf.Nr 20-3506
